

# Gemeinsames Projekt „Elberfeld 2030/2034“ Stadt Wuppertal und WSW

Sachstandsbericht in der Innenstadtkonferenz am  
02.05.2023 in der Sparkassenfiliale Döppersberg


Gerhard Daun, Simon Utzeri

**WUPPEN  
WIR'S**

- Aktueller Sachstand
- Neuer Bauzeitenplan auf Basis der archäologischen Situation
- Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz
- Gleichzeitigkeit von Baumaßnahmen (Basis heutiger Stand der Planung)


- Überarbeitung und Anpassung von Bauzeit und Baukosten aufgrund der archäologischen Situation (neuer Bsn.-Plan)
- Aufsichtsratsbeschluss zur weiteren Umsetzung der Fernwärmestrategie, insbesondere im Kernbereich der Innenstadt Elberfeld (Februar 2023)
- Projektgruppe Stadt und WSW (ISEK/FW-Strategie) - Durchführung von zwei Workshops (13./20. März 2023) mit den Zielen:
  - Abstimmung und Festlegung der Rahmenbedingungen zur baulichen Umsetzung
  - Vorbereitung der Vorstellung der Arbeitsergebnisse im Verwaltungsvorstand der Stadt (24. April 2023)
- Die weiteren Abstimmungen mit den Prozessbeteiligten im Rahmen der Projektumsetzung laufen derzeit (R101, R103, R104, R105)

# Neuer Bauzeitenplan auf Basis der archäologischen Situation

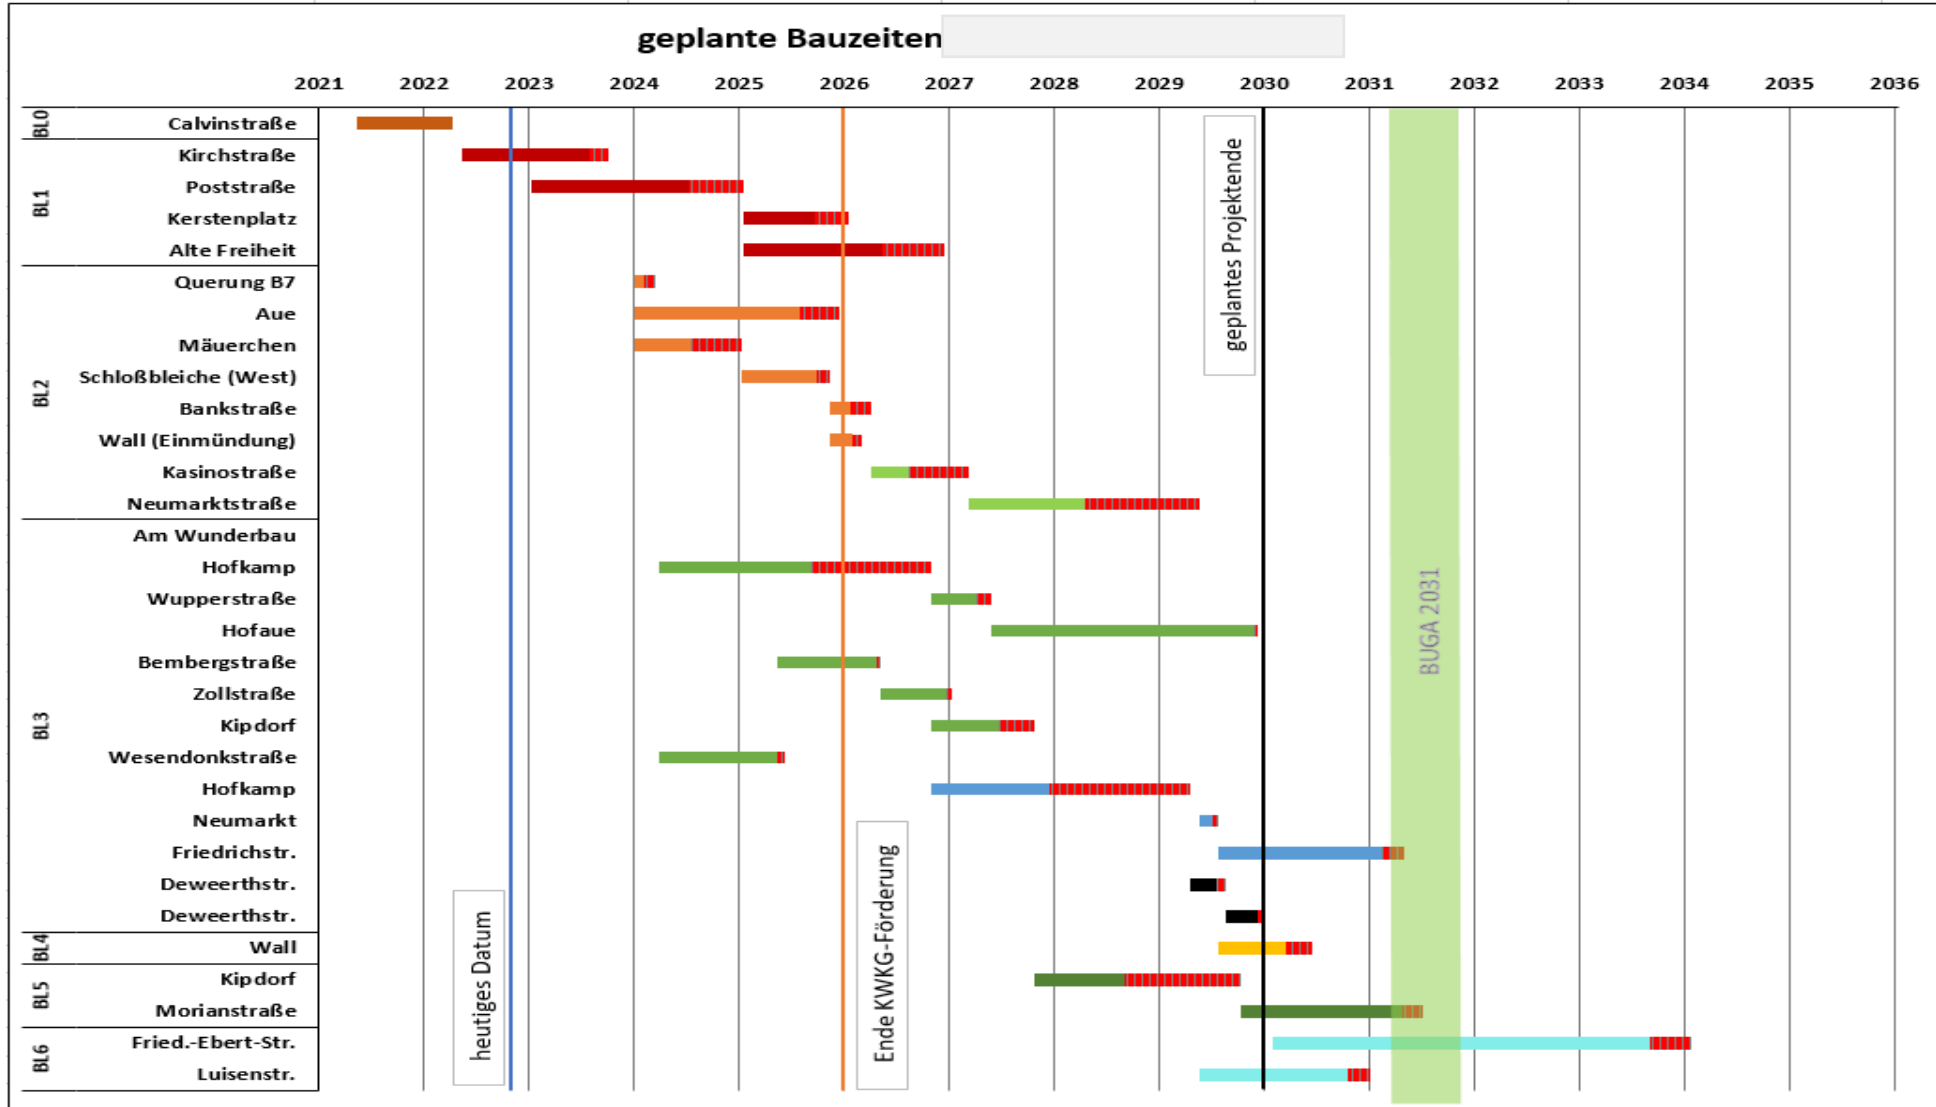

# Zielnetz Elberfelder Innenstadt nach dem Umbau


Projektstart 2020  
Geplante Fertigstellung 2034

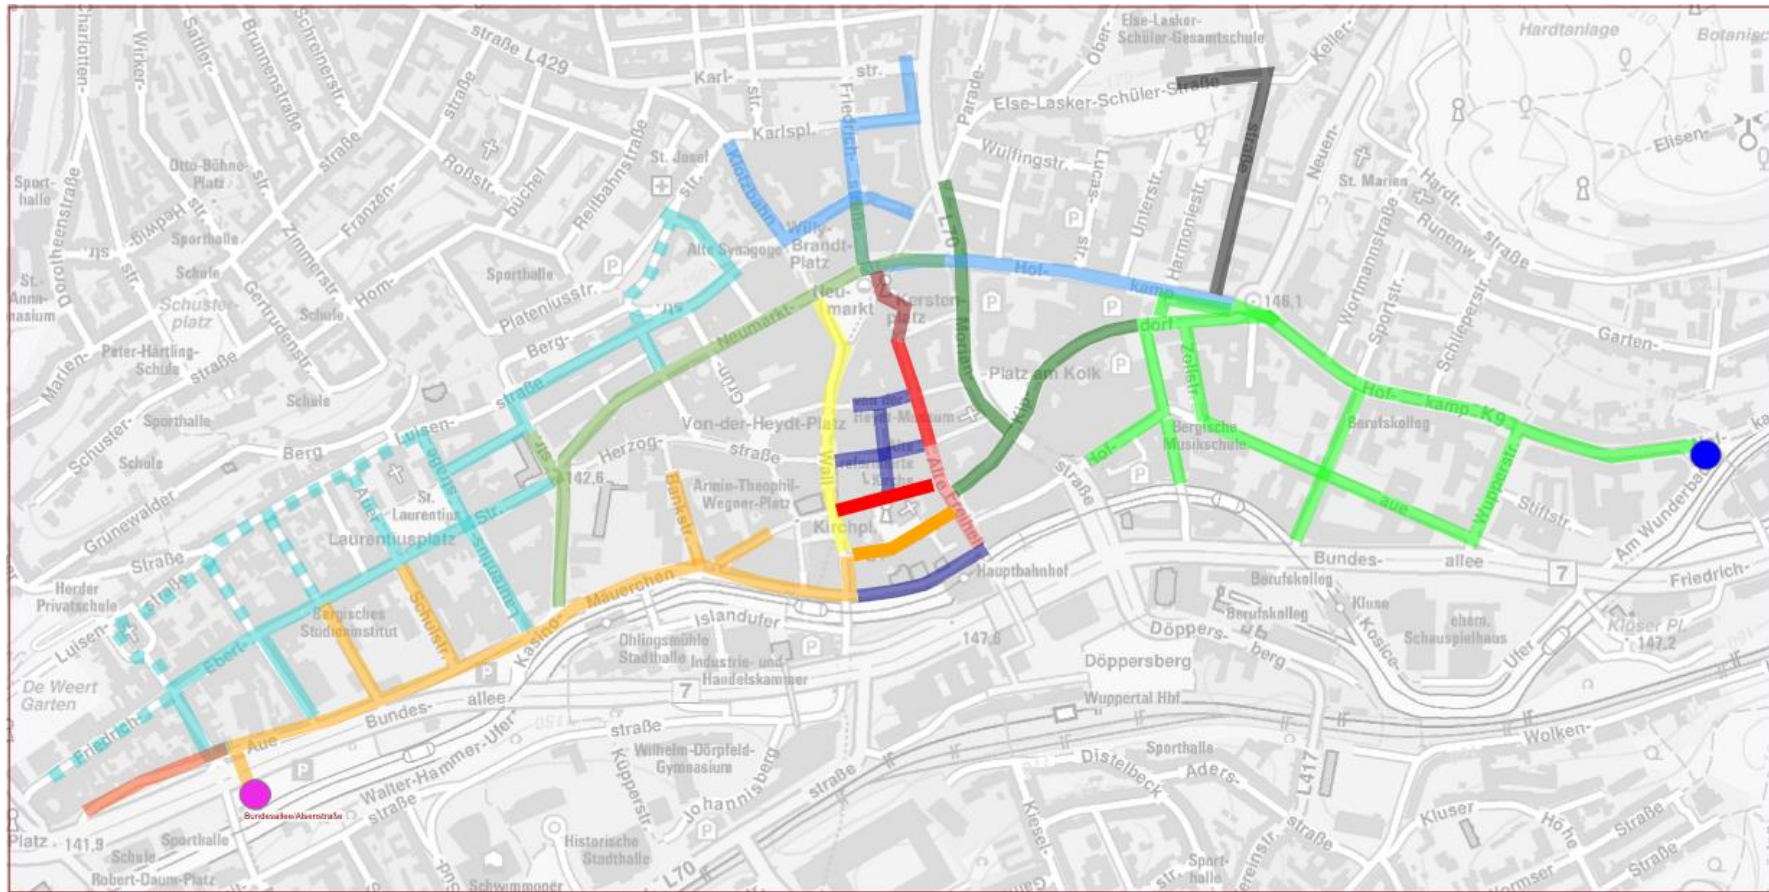



# Bestandsnetz Elberfelder Innenstadt heute


Dampfnetz Wiederaufbau nach 1945 bis in die 1960er Jahre  
Ein Großteil der Leitungen verlaufen durch die Bestandsgebäude

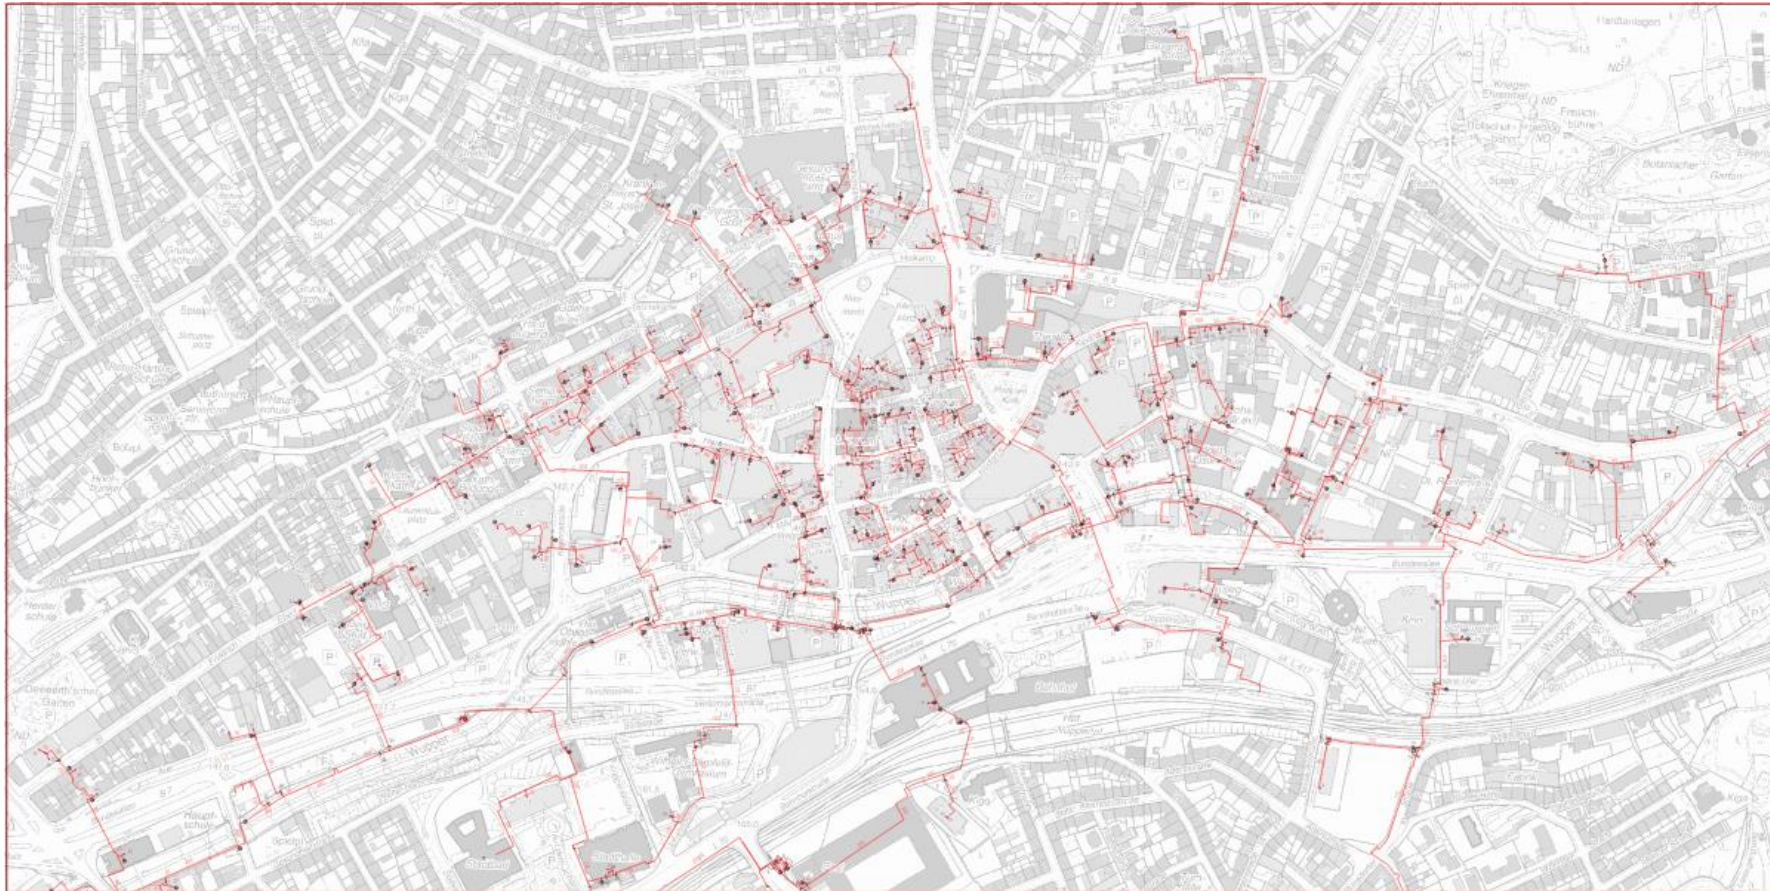



# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz


Vorgezogene Maßnahme in der Calvinstraße Baustart Mai 2021  
Fertigstellung April 2022

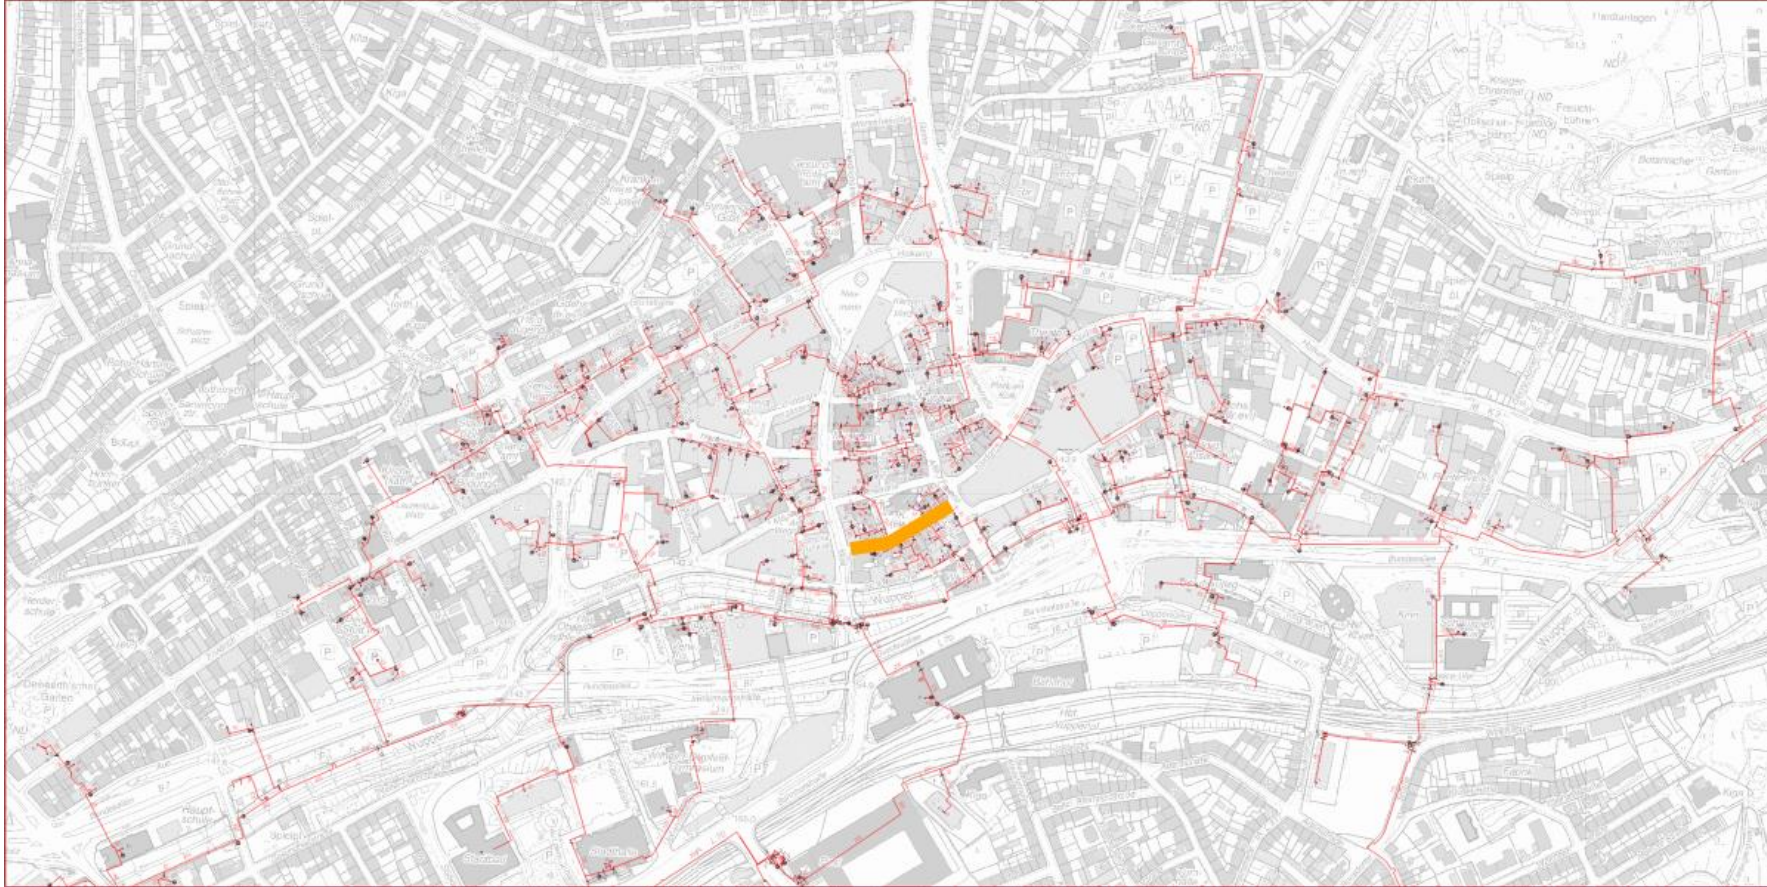



# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz


Baulos 1 Baustart im Mai 2022 in der Kirchstraße  
und Poststraße im März 2023

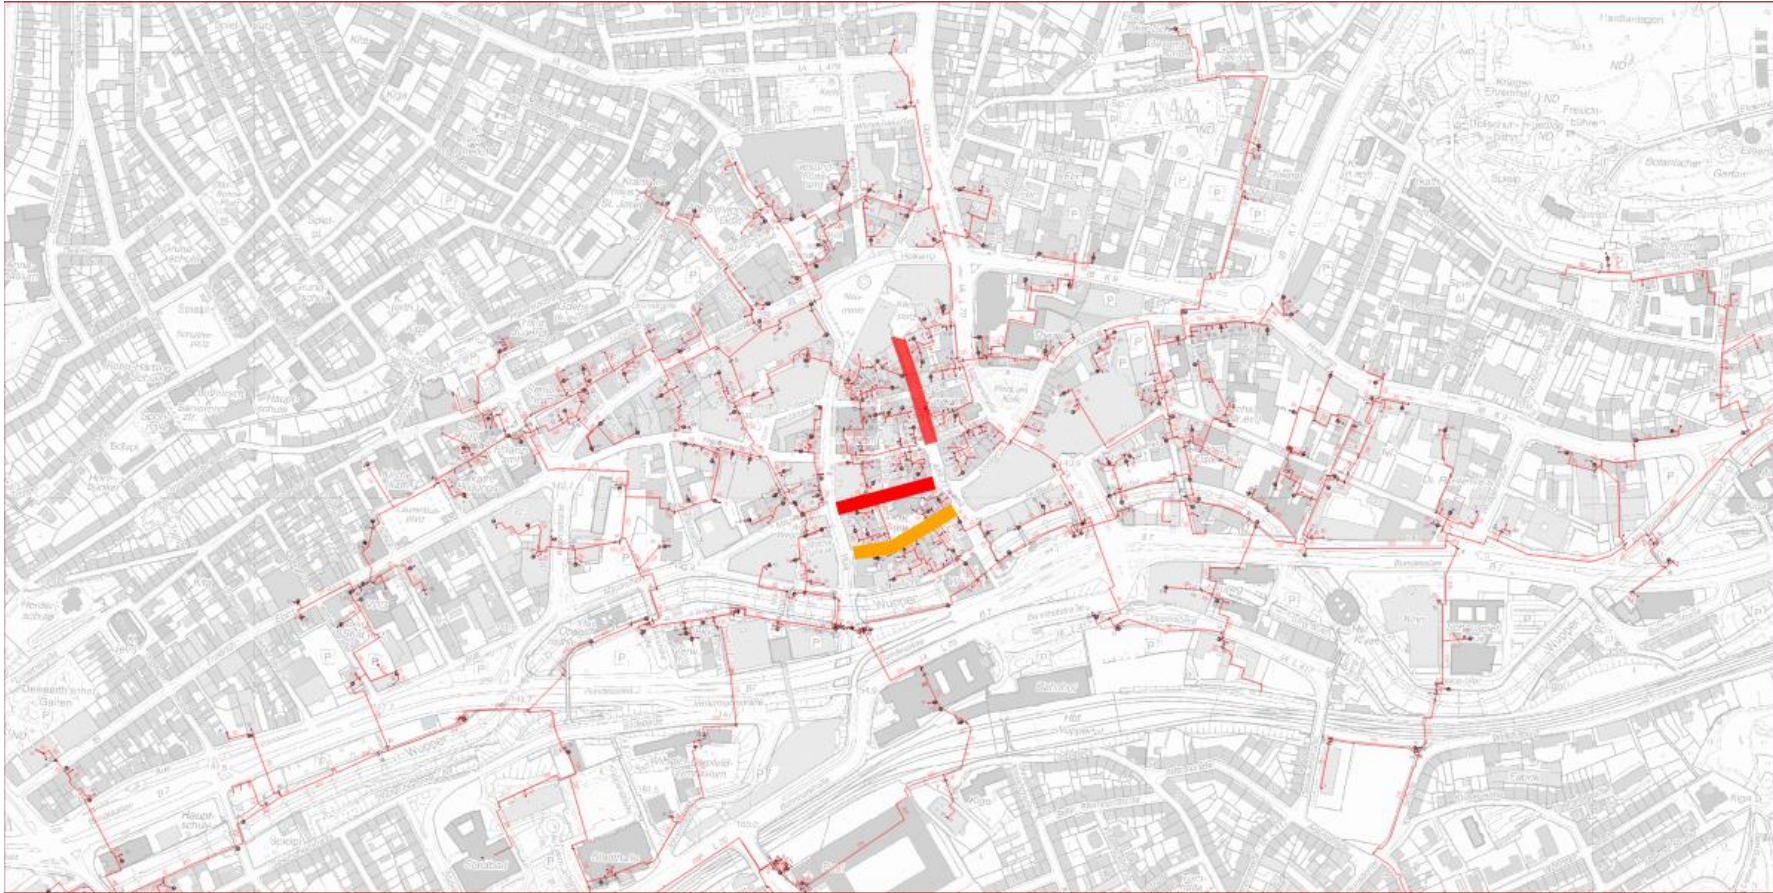



# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz


Geplanter Start Bauabschnitt 2 im 1. Quartal 2024

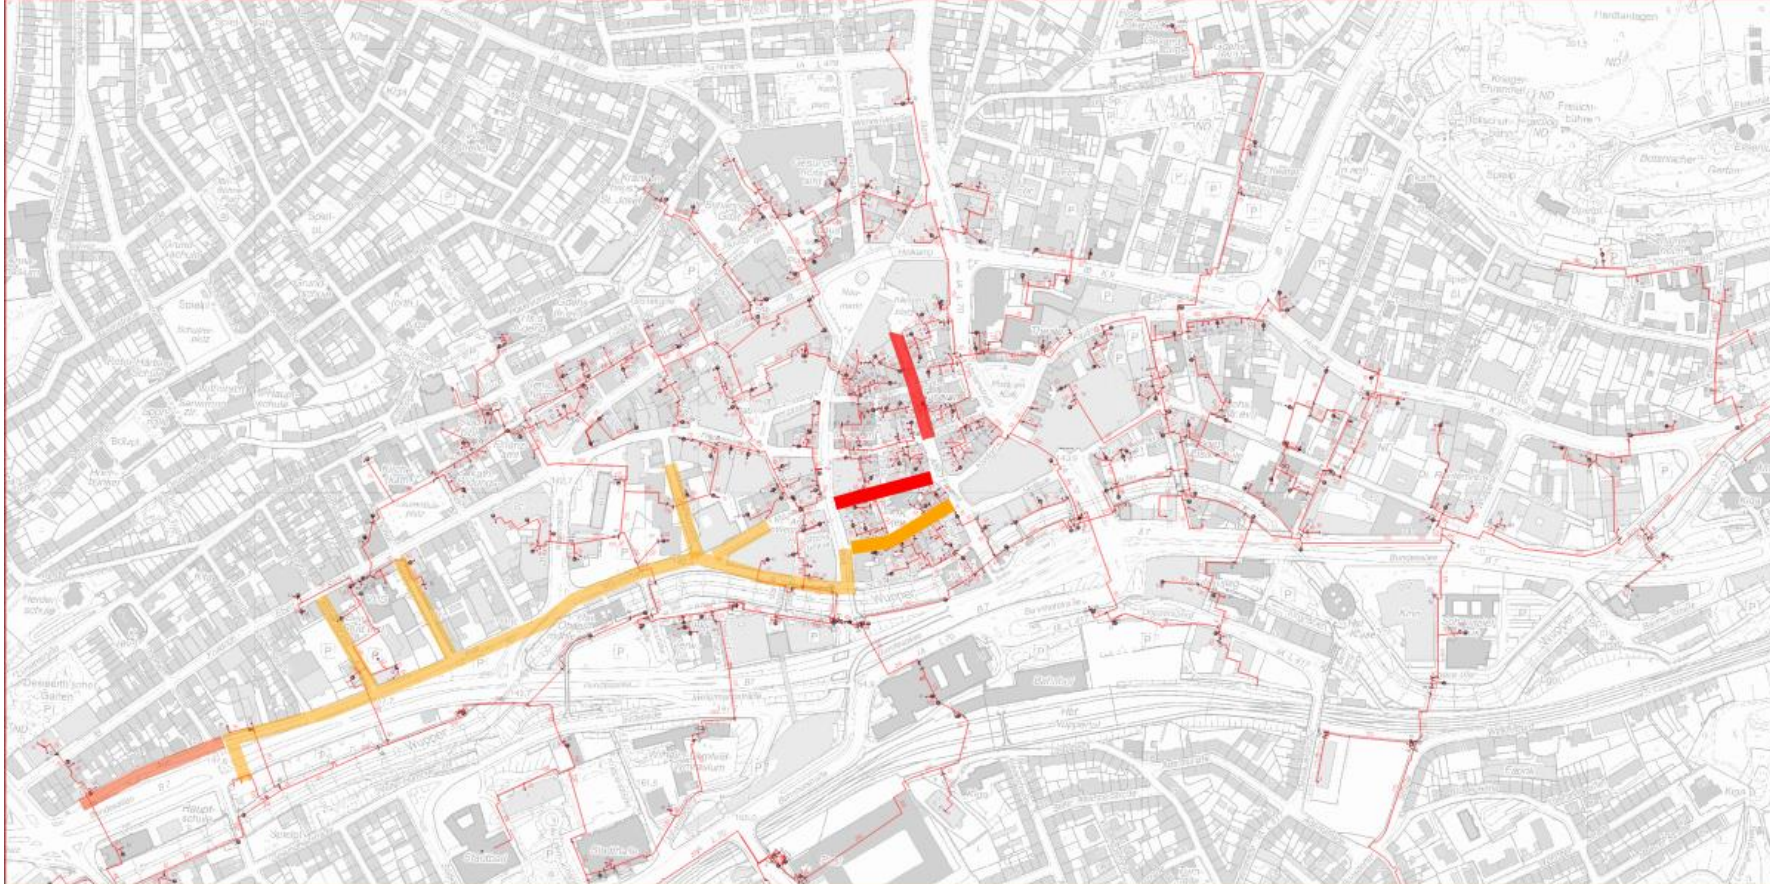



# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz

Geplanter Start Bauabschnitt 3 im 2. Quartal 2024

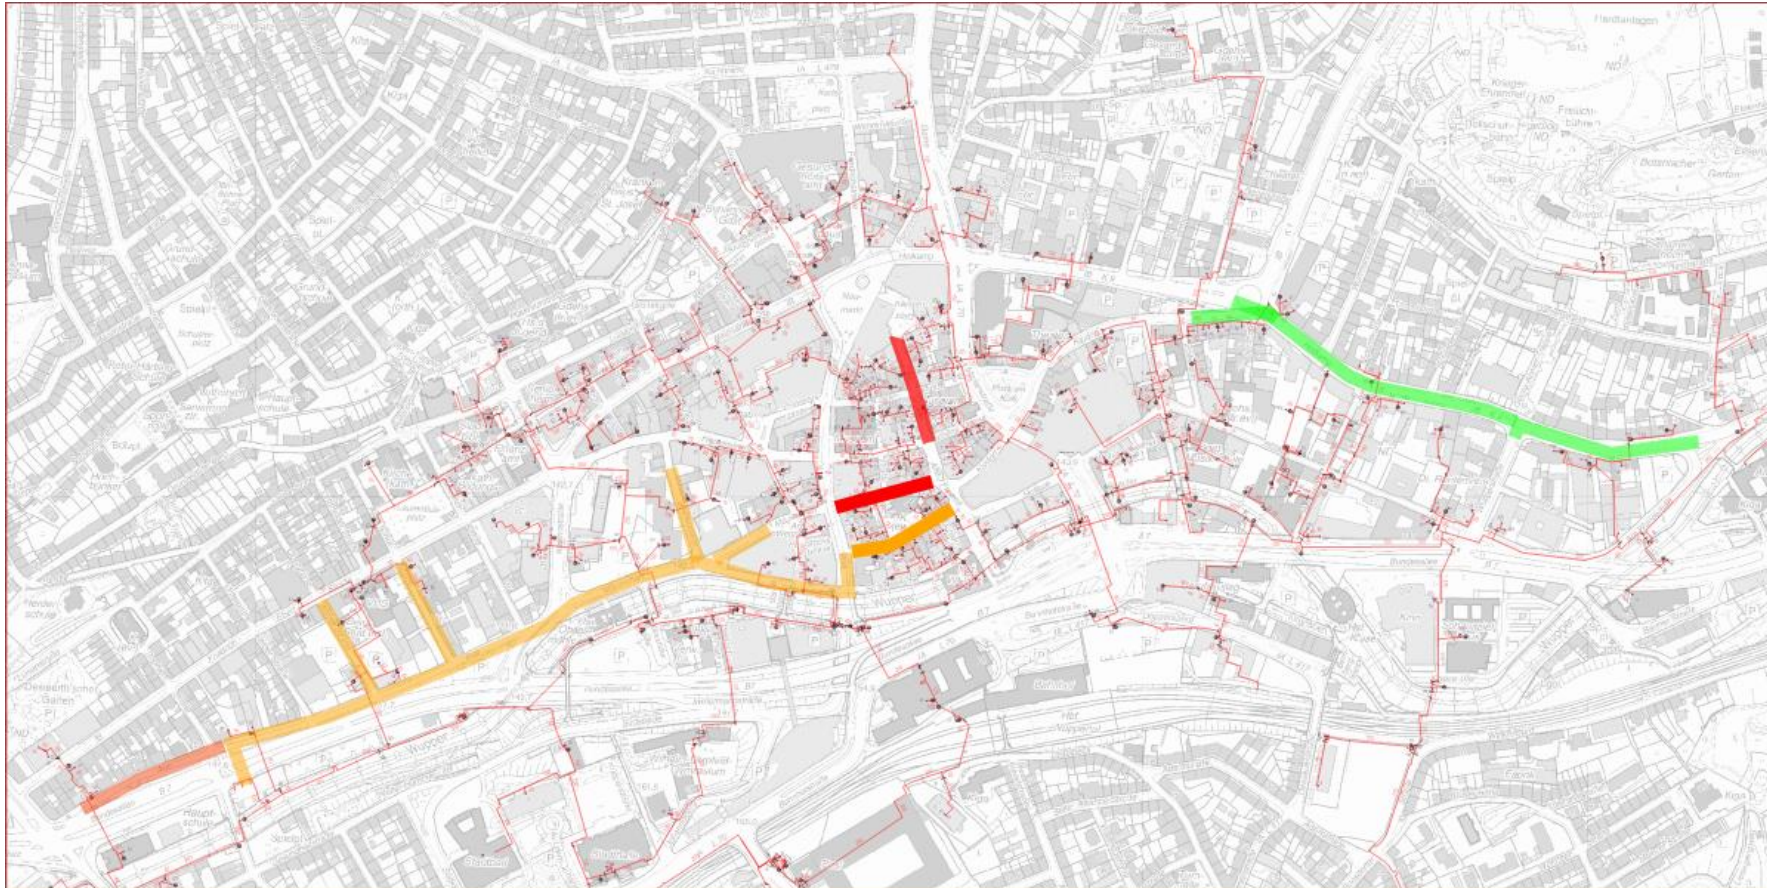




# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz

Projektstart 2020

Baustart Mai 2022 in der Calvinstraße

Geplante Fertigstellung 2034

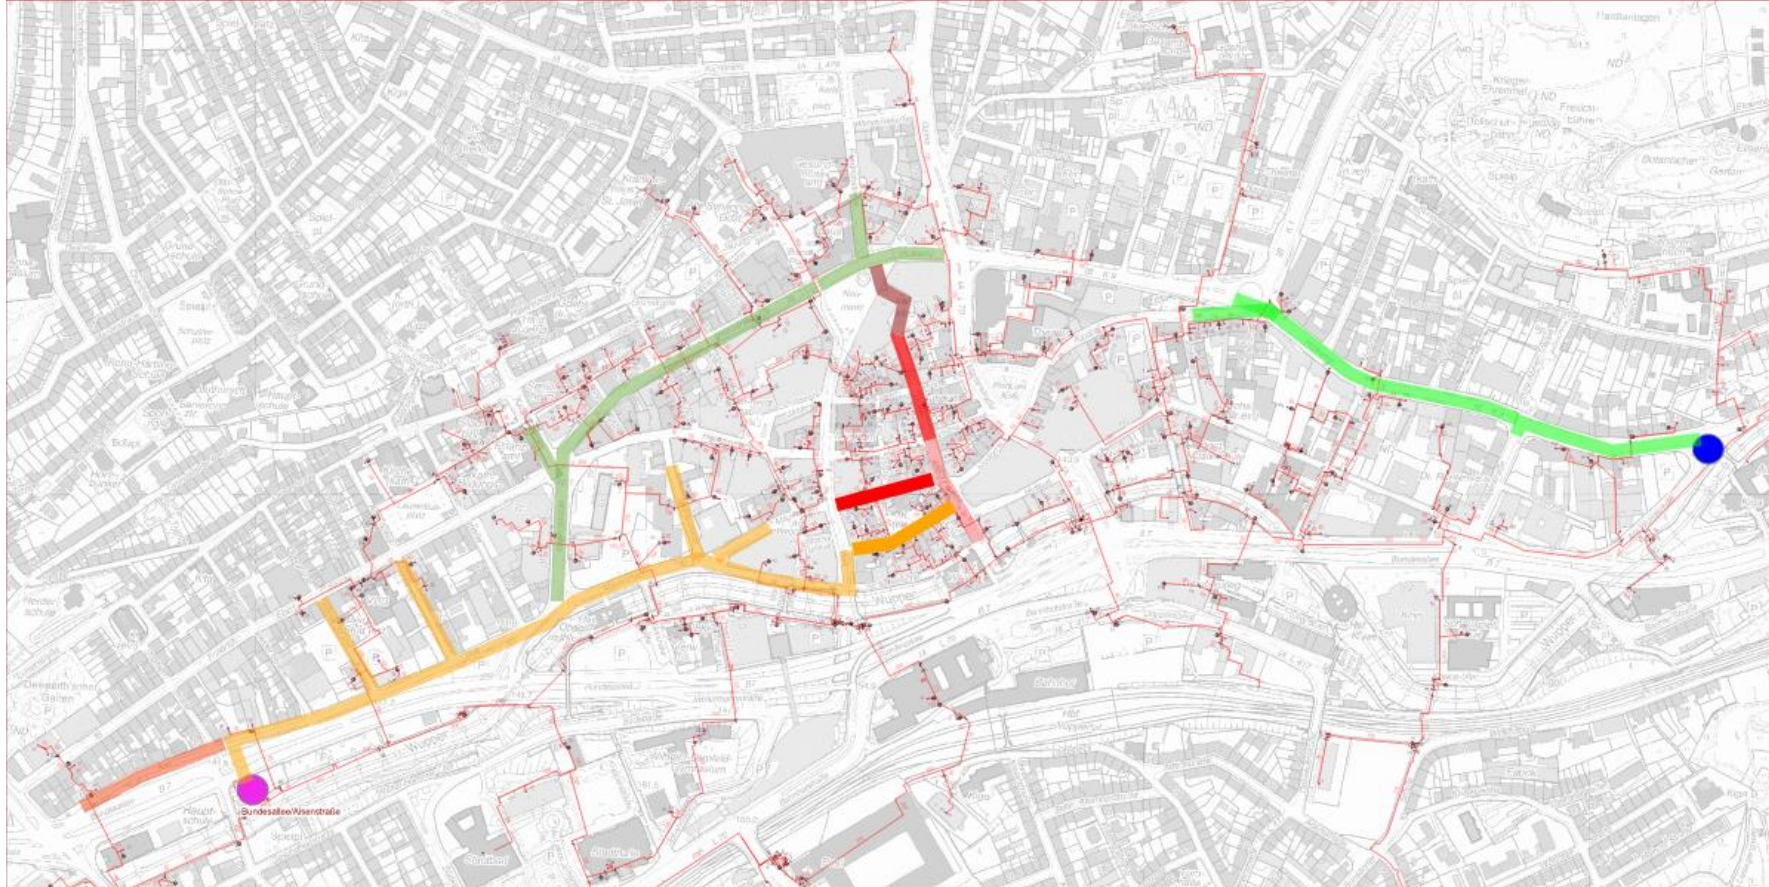




# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz

Projektstart 2020

Baustart Mai 2022 in der Calvinstraße


Geplante Fertigstellung 2034

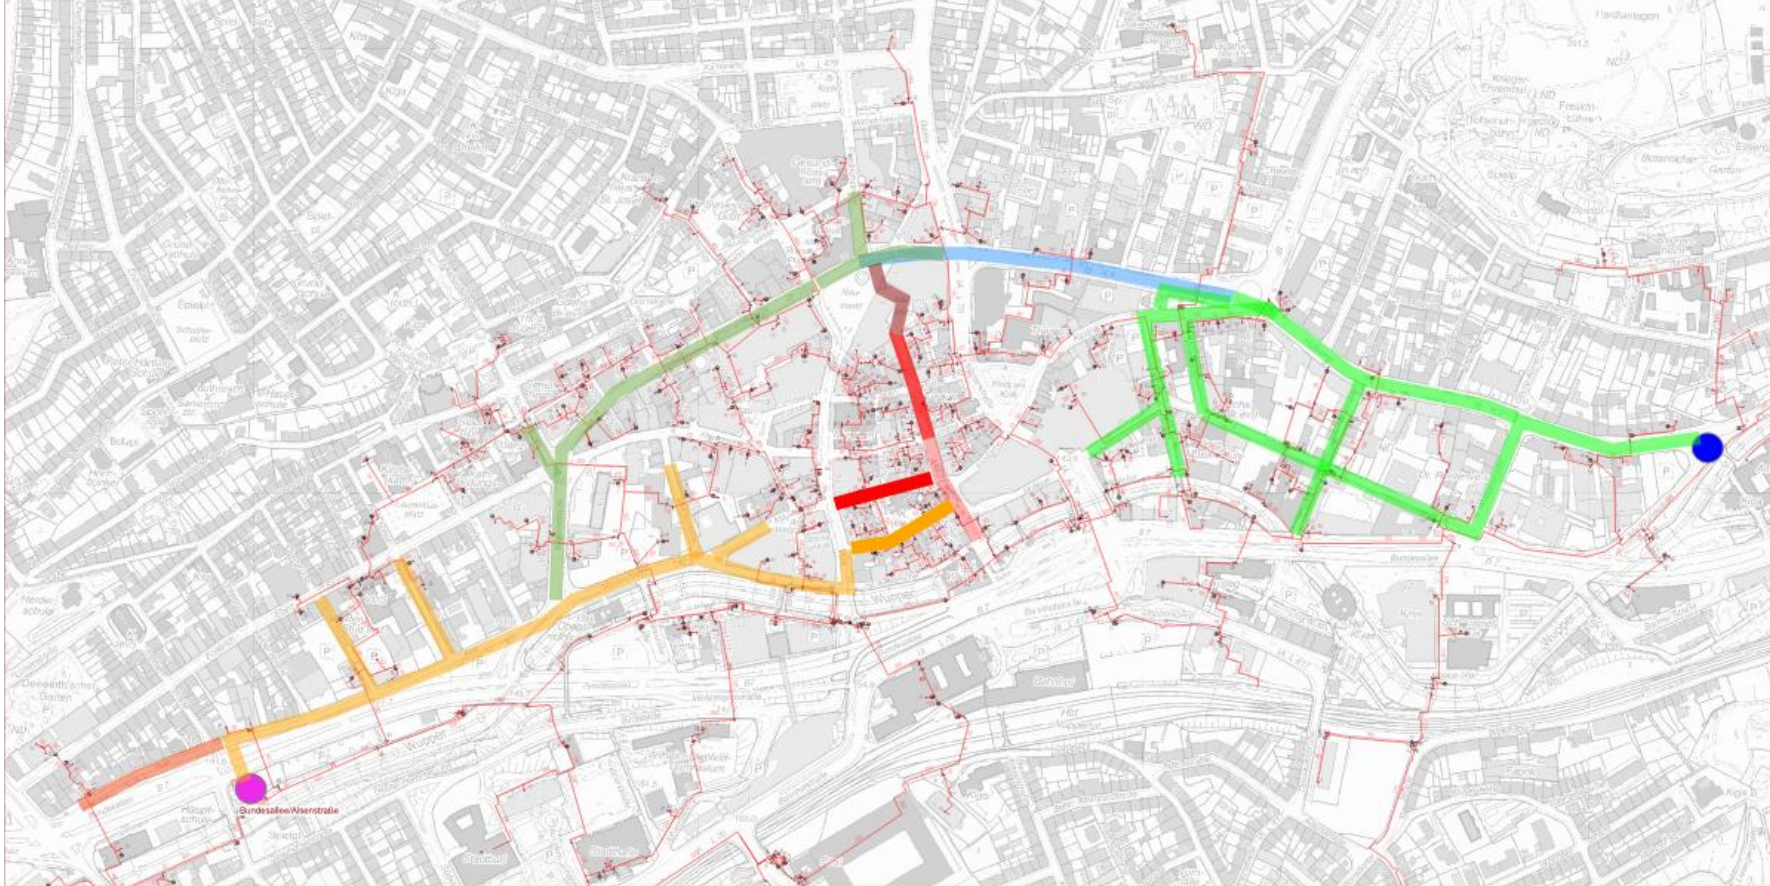



# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz


Baulose 4 -6 noch in Planung  
Geplante Fertigstellung 2034

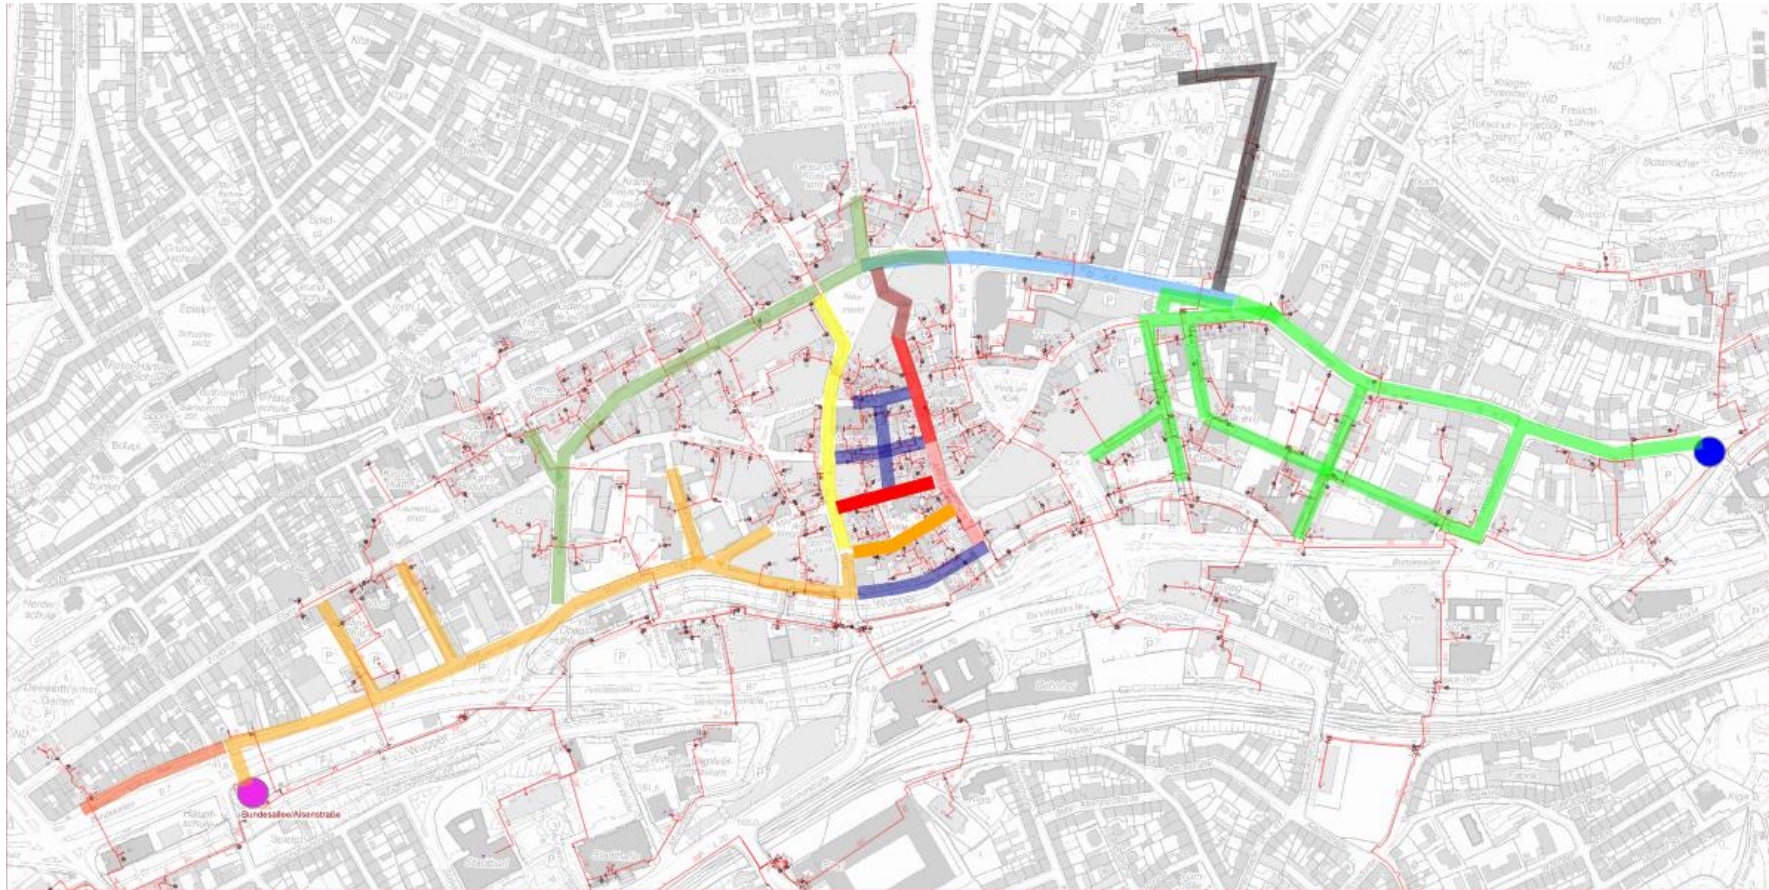



# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz


Baulose 4 -6 noch in Planung  
Geplante Fertigstellung 2034

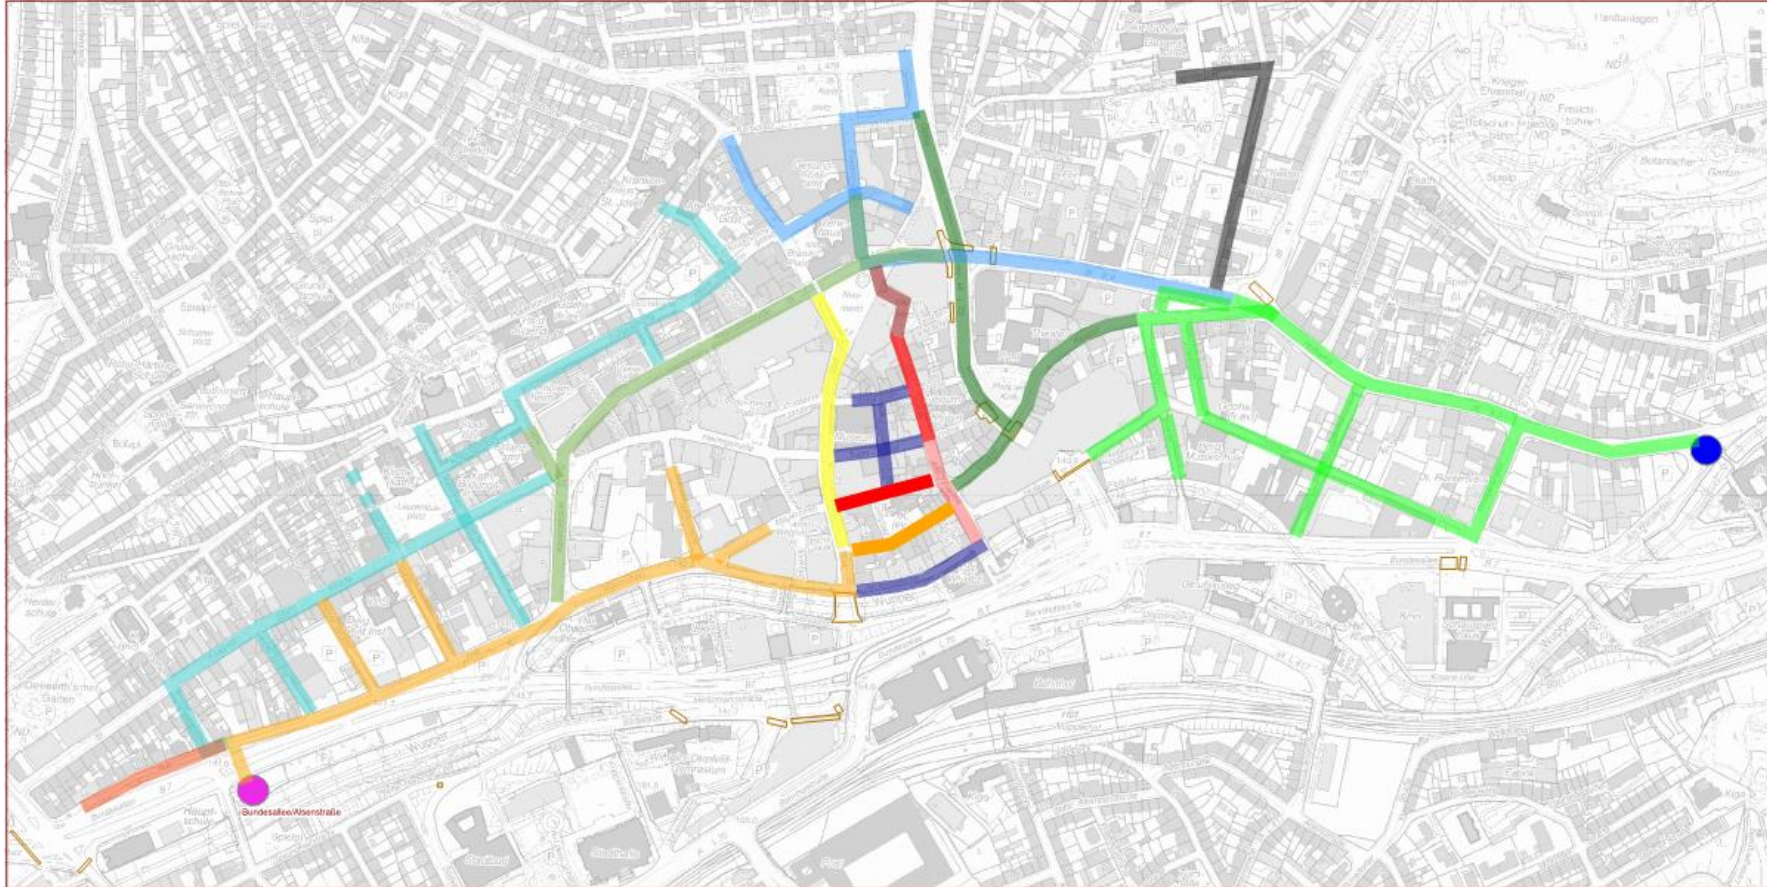



# Darstellung der Bauabfolge hin zum Zielnetz

## Weiterer Ausbau

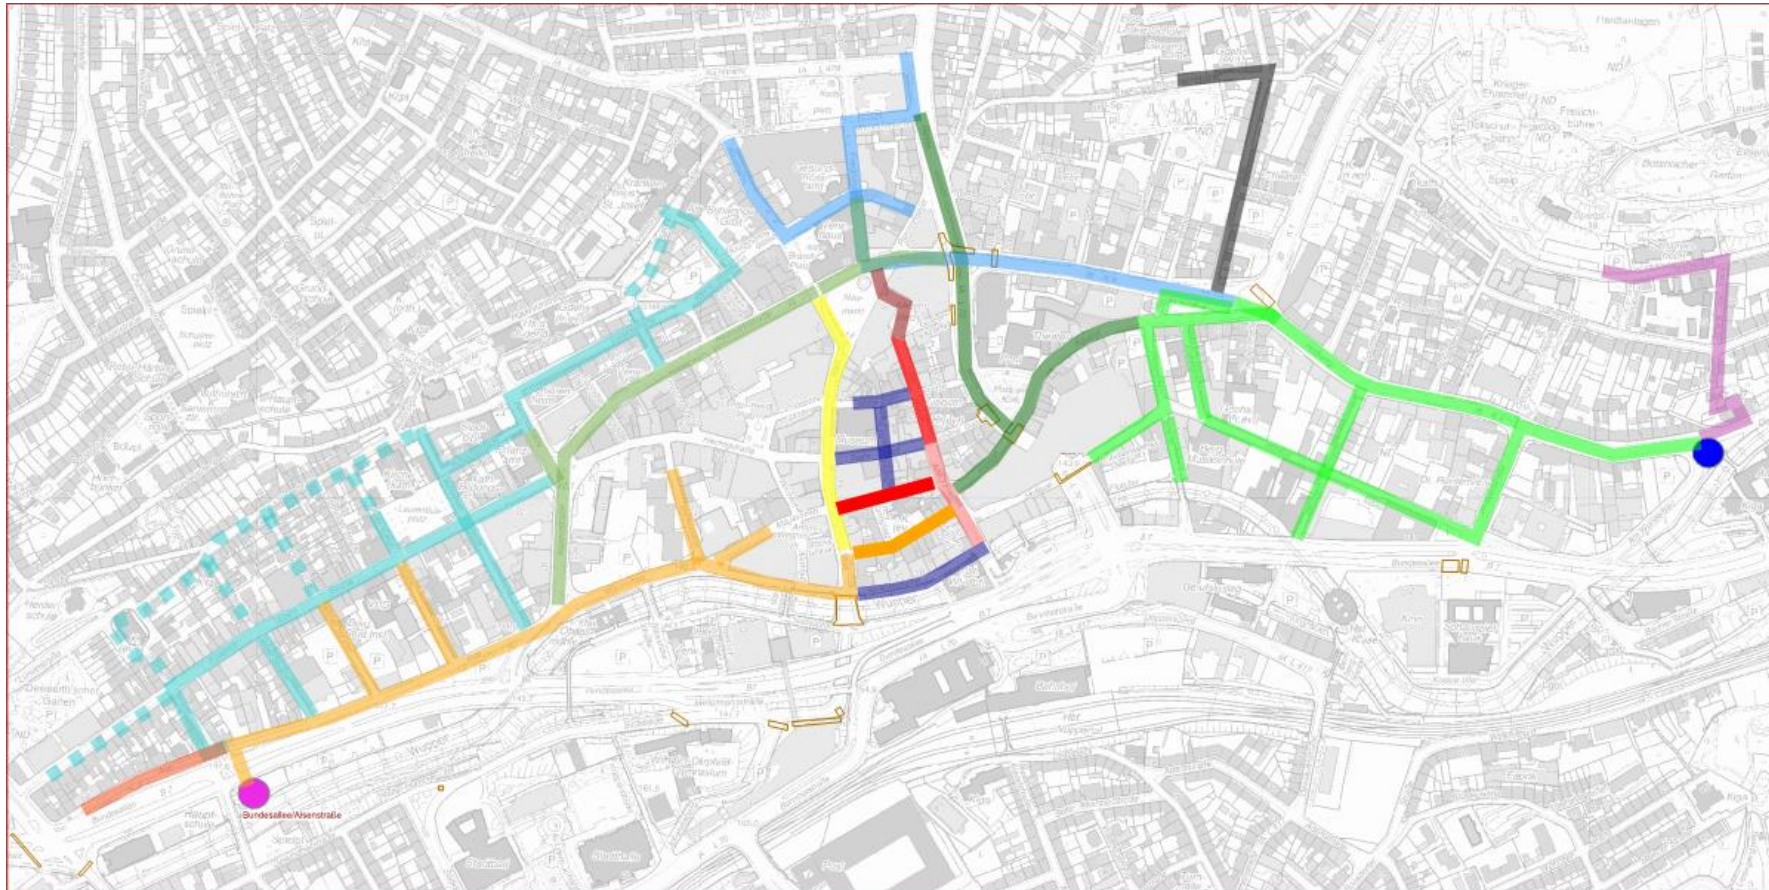






# Geplante Arbeiten in 2023


Kirchstraße geplante Fertigstellung Ende 2023  
Poststraße, Alte Freiheit

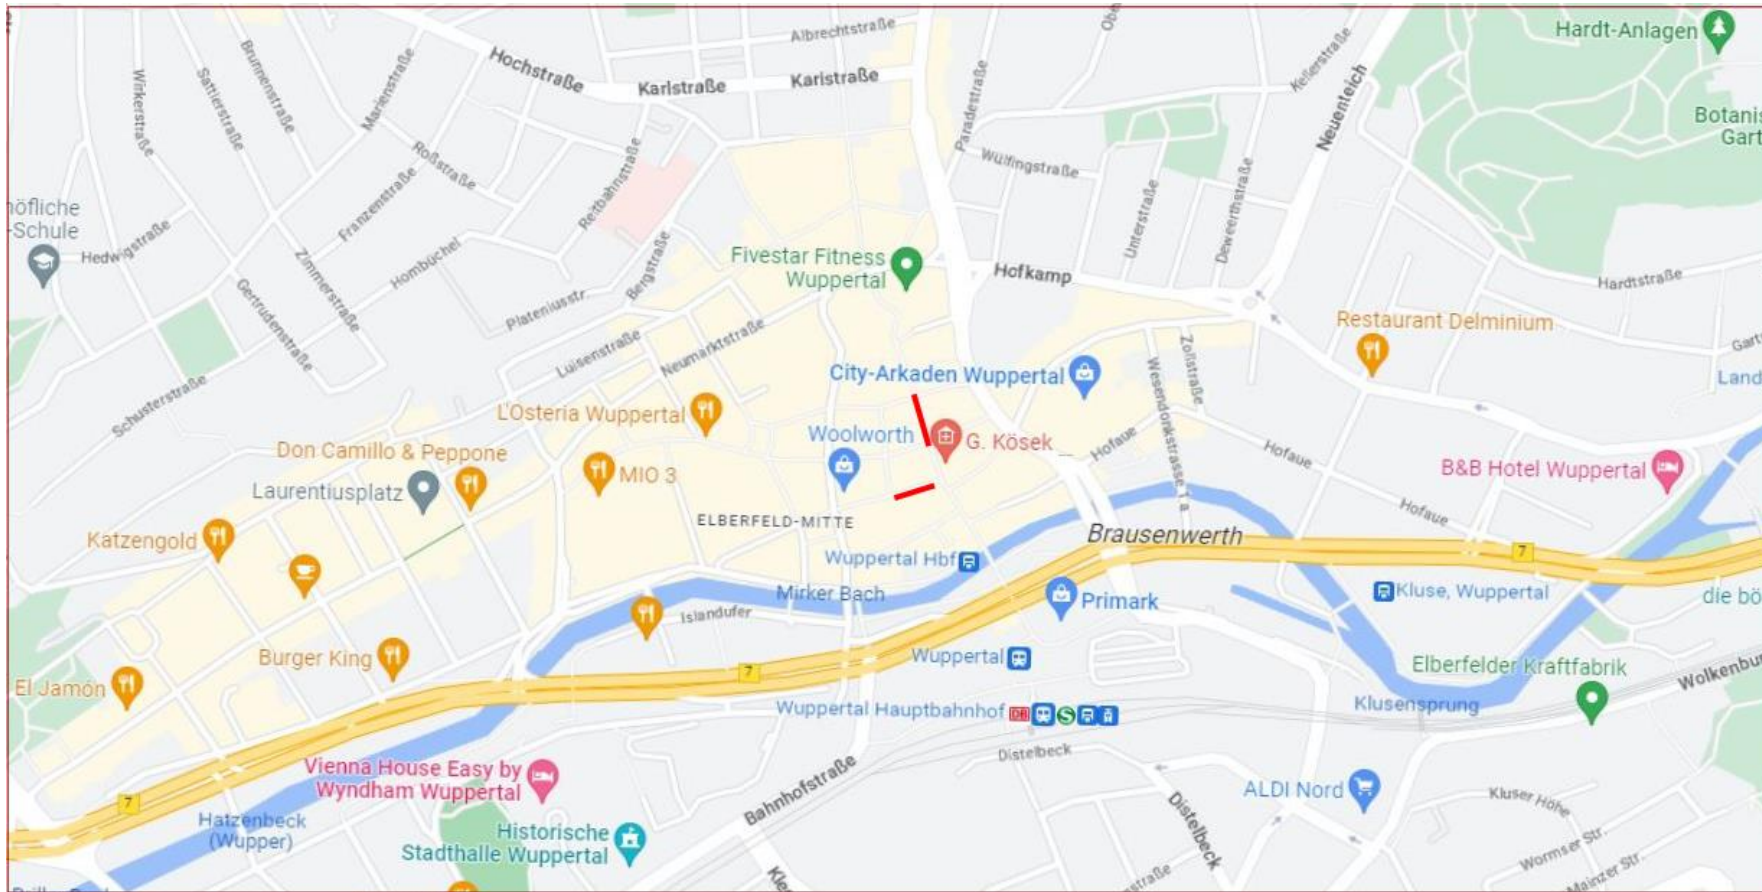




# Geplante Arbeiten in 2024

Poststraße, Grabenstraße, Alte Freiheit, Aue,  
Auer Schulstraße, Mäuerchen, Hofkamp, Wesendonkstraße

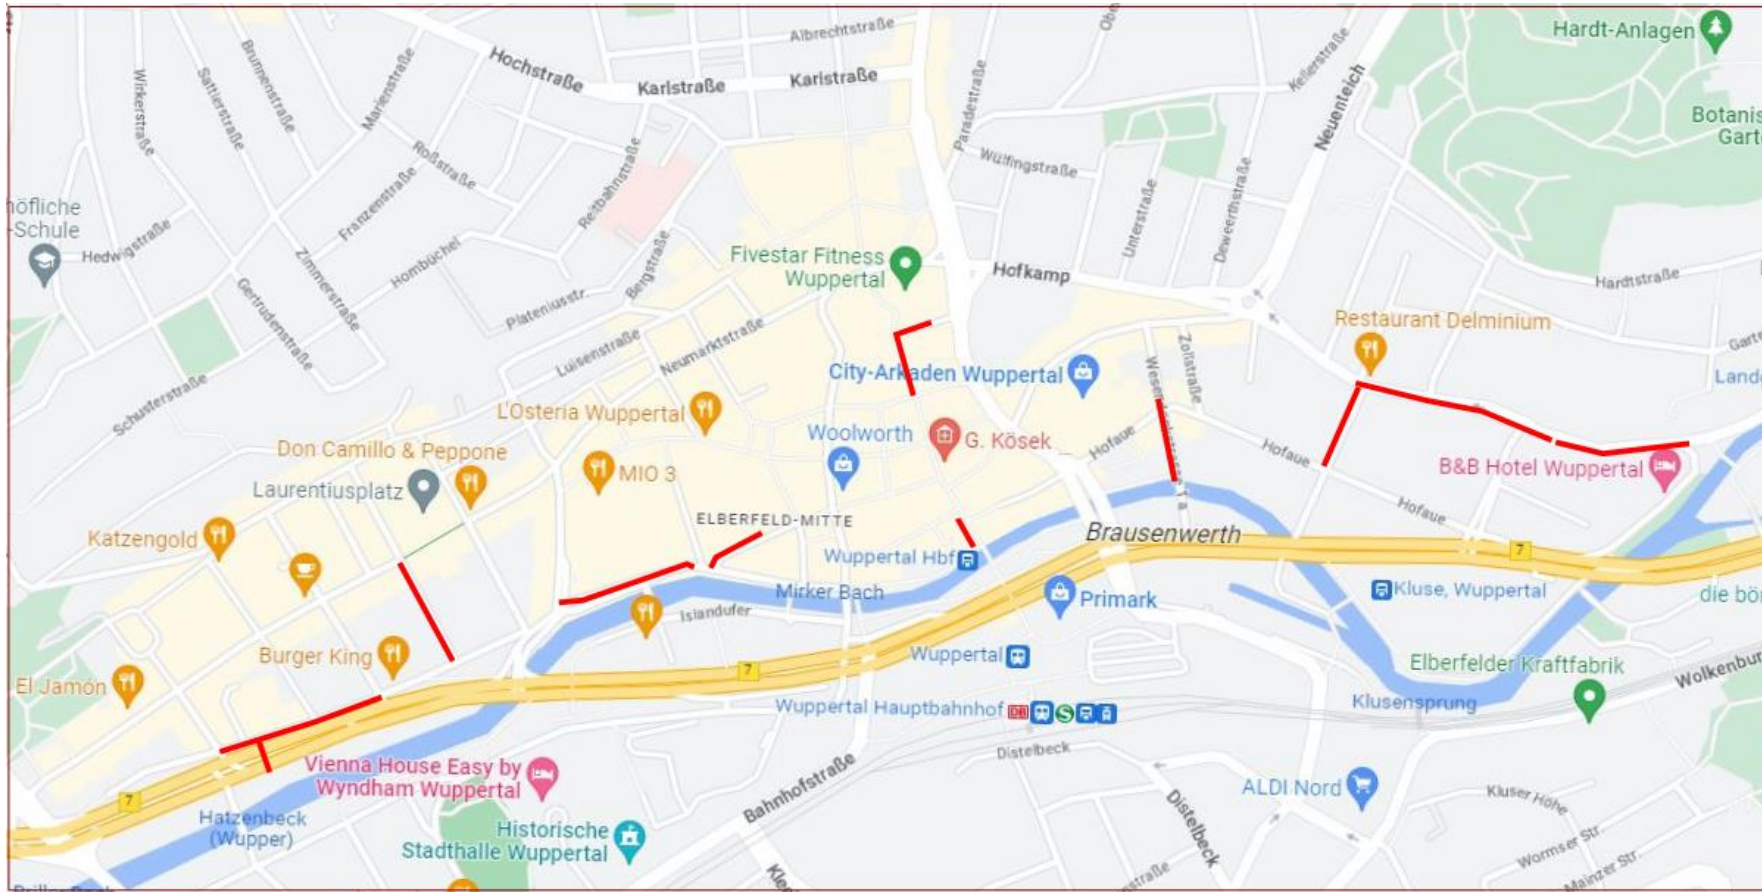

# Geplante Arbeiten in 2025

Kerstenplatz, Alte Freiheit, Kipdorf, Aue, Obergrünewalderstraße, Schloßbleiche, Bankstraße, Hofkamp, Wesendonkstraße,

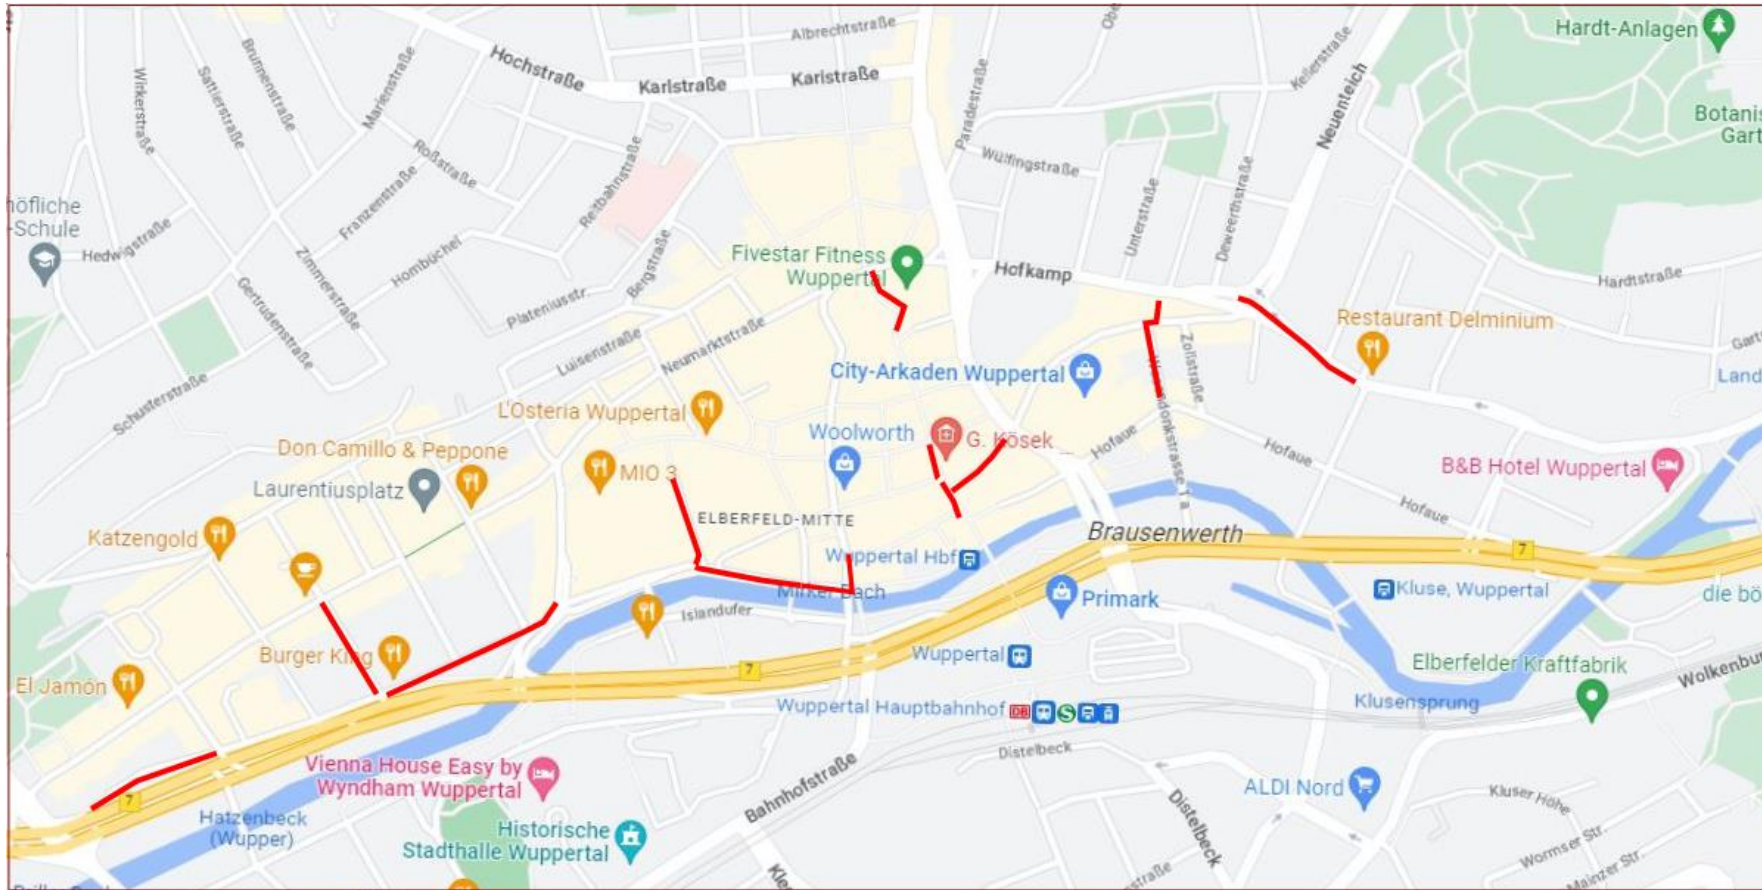




# Geplante Arbeiten in 2026


## Friedrichstraße

Kasinostraße, Schloßbleiche, Schwanenstraße, Burgstraße, Turmhof, Hofkamp, Bembergstraße, Zollstraße

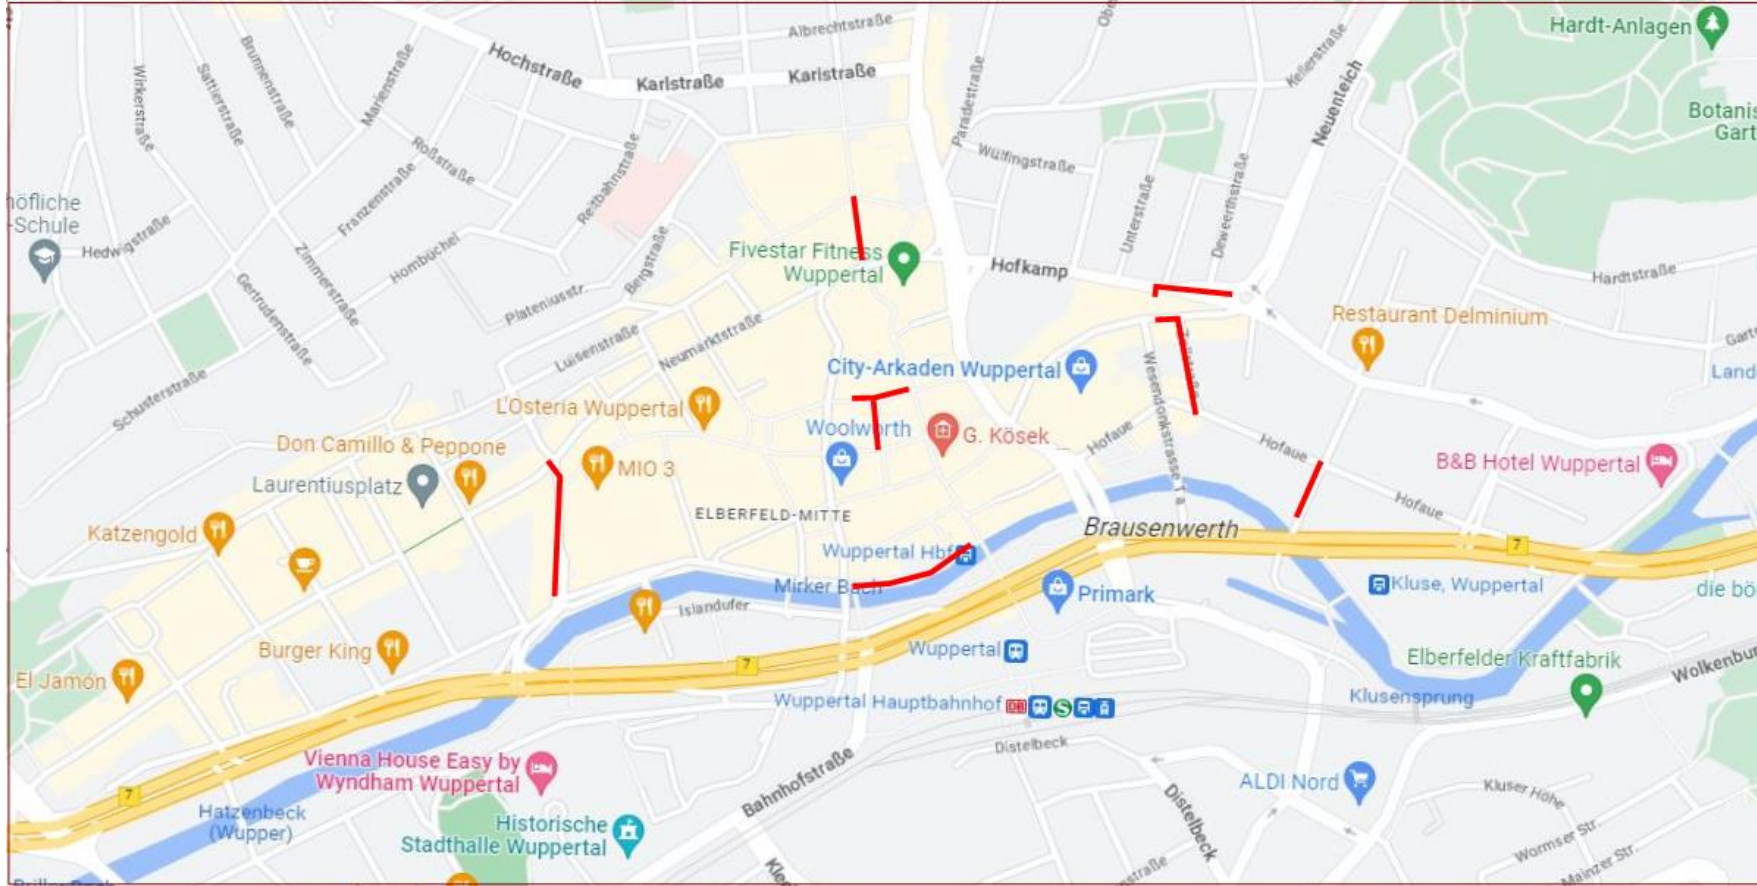

# Geplante Arbeiten in 2027


Neumarktstraße,  
Hofkamp, Hofaue, Bembergstraße

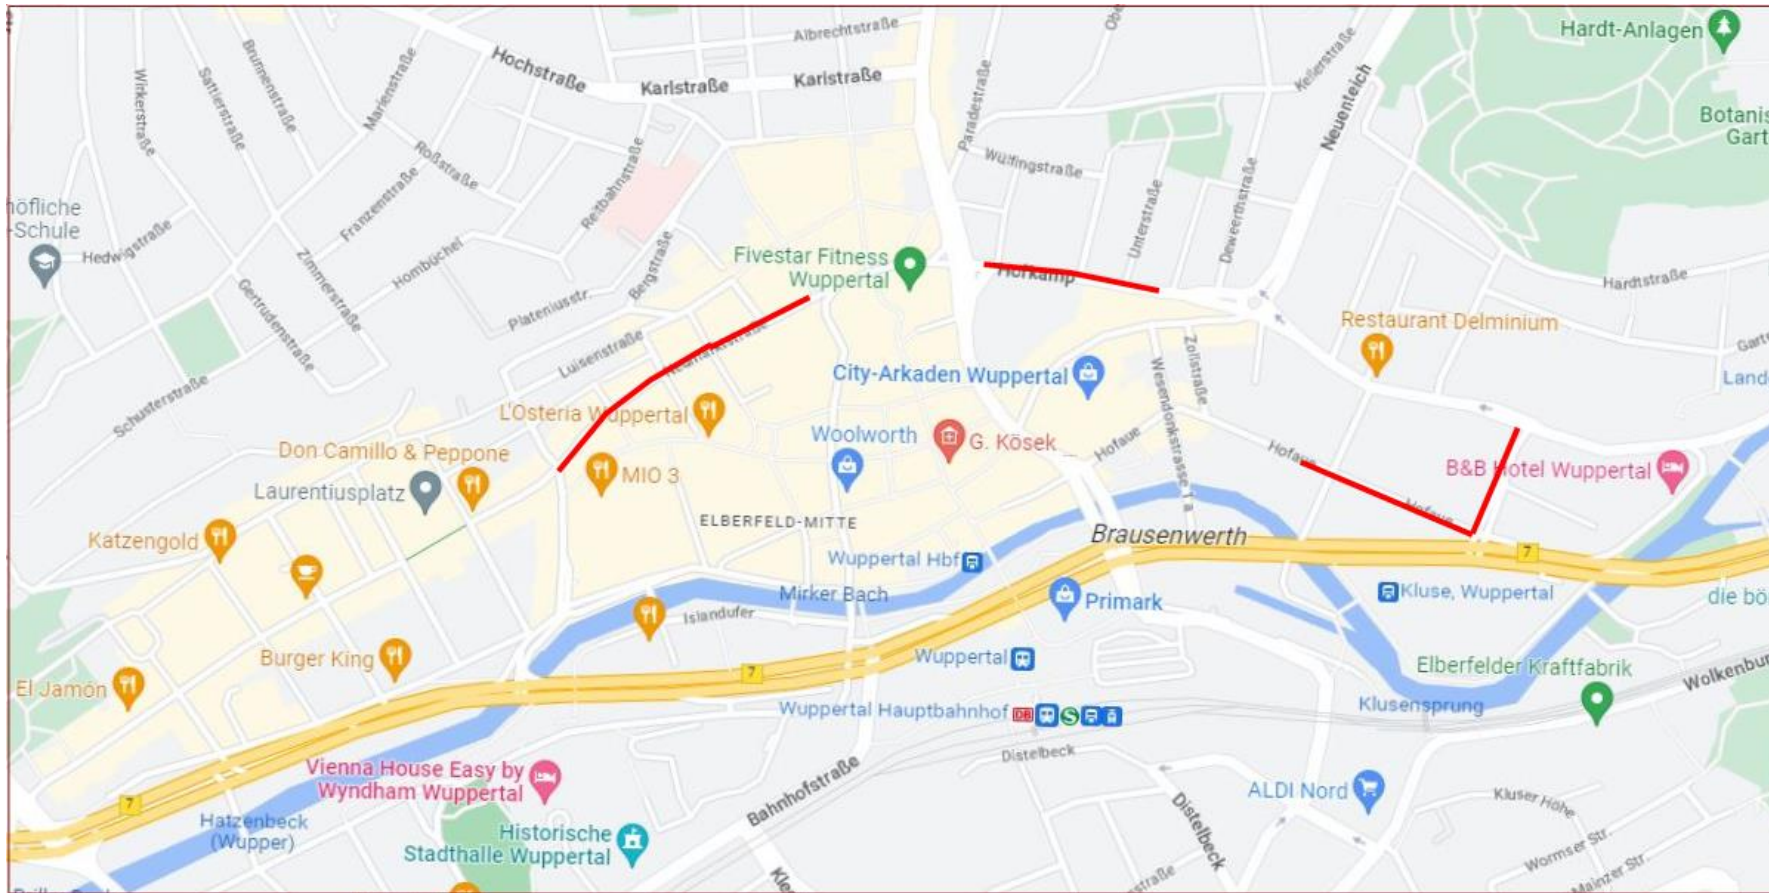




# Geplante Arbeiten in 2028

## Kipdorf, Hofaue

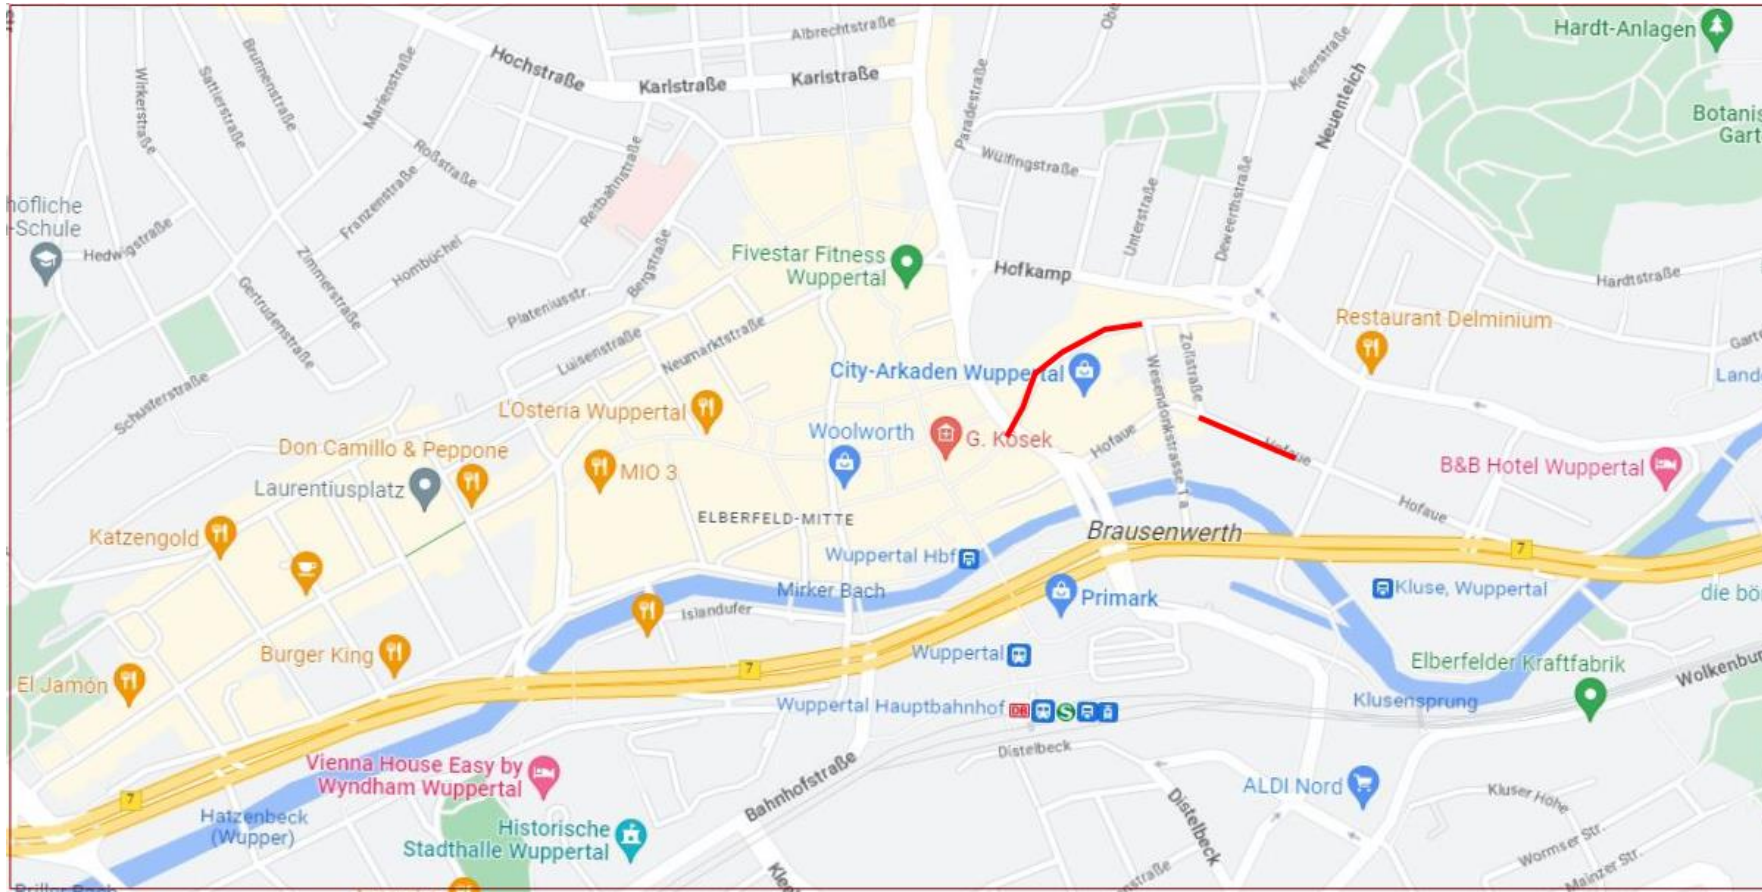

# Geplante Arbeiten in 2029

## Neumarkt, Deweerthstraße

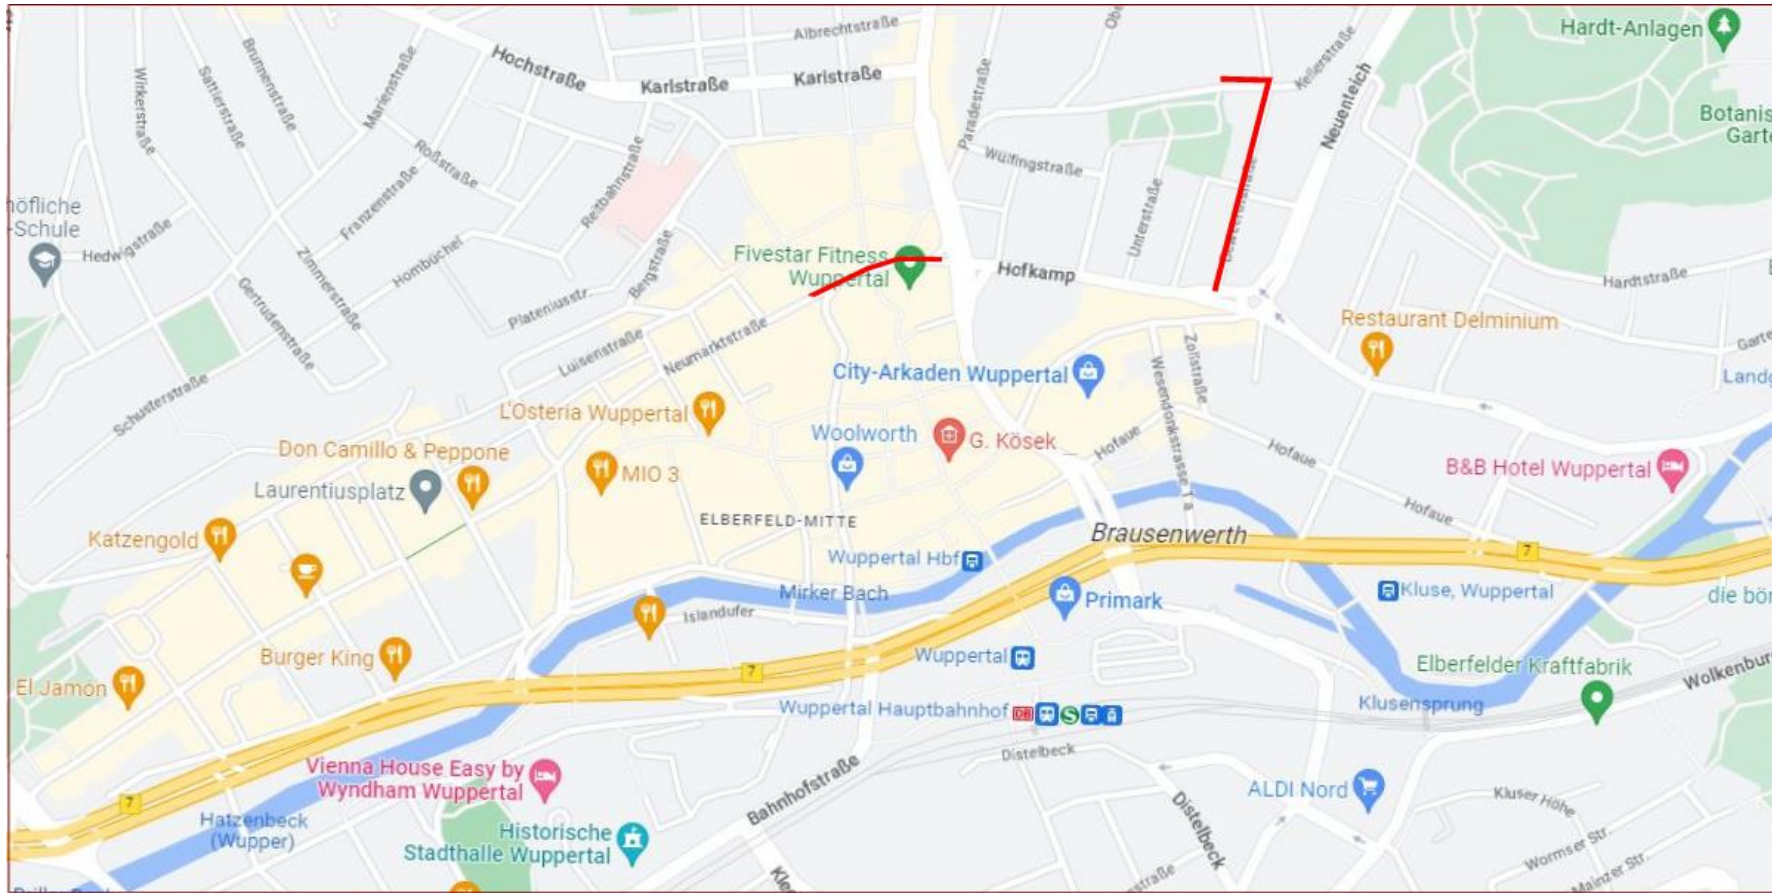




# Geplante Arbeiten in 2030

Morianstraße, Gathe,  
Wall, Luisenstraße, Friedrich-Ebert-Straße



# Geplante Arbeiten in 2031


Friedrich-Ebert-Straße,  
Klotzbahn,

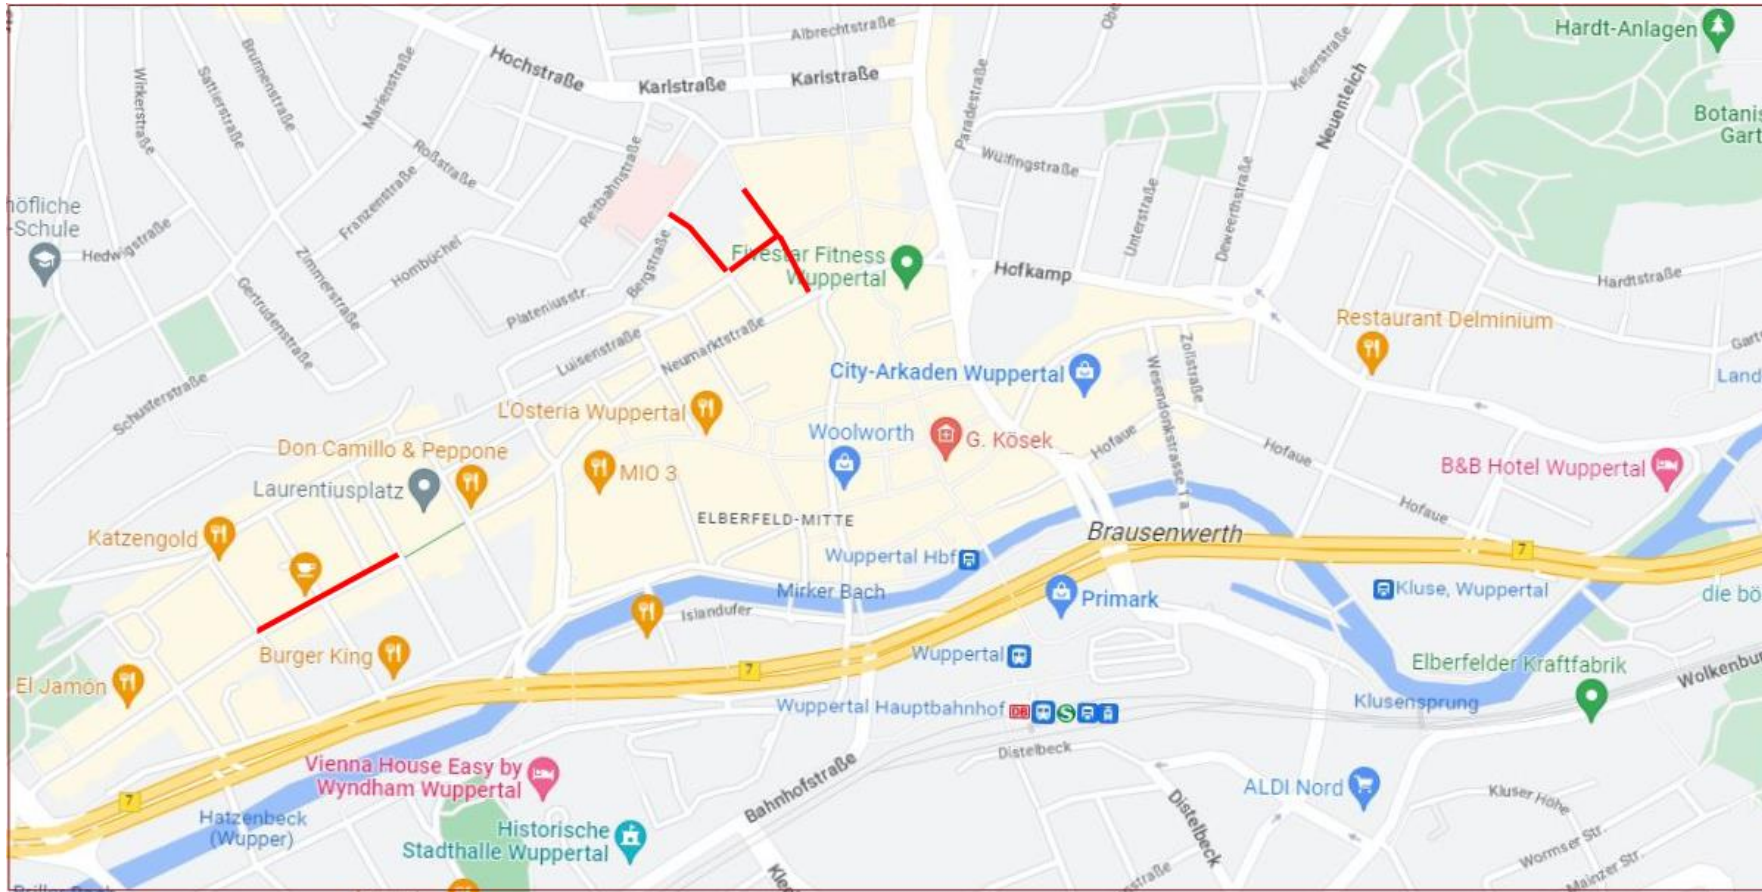




# Geplante Arbeiten in 2032

Friedrich-Ebert-Straße, Sophienstraße,  
Obergrünewalderstraße

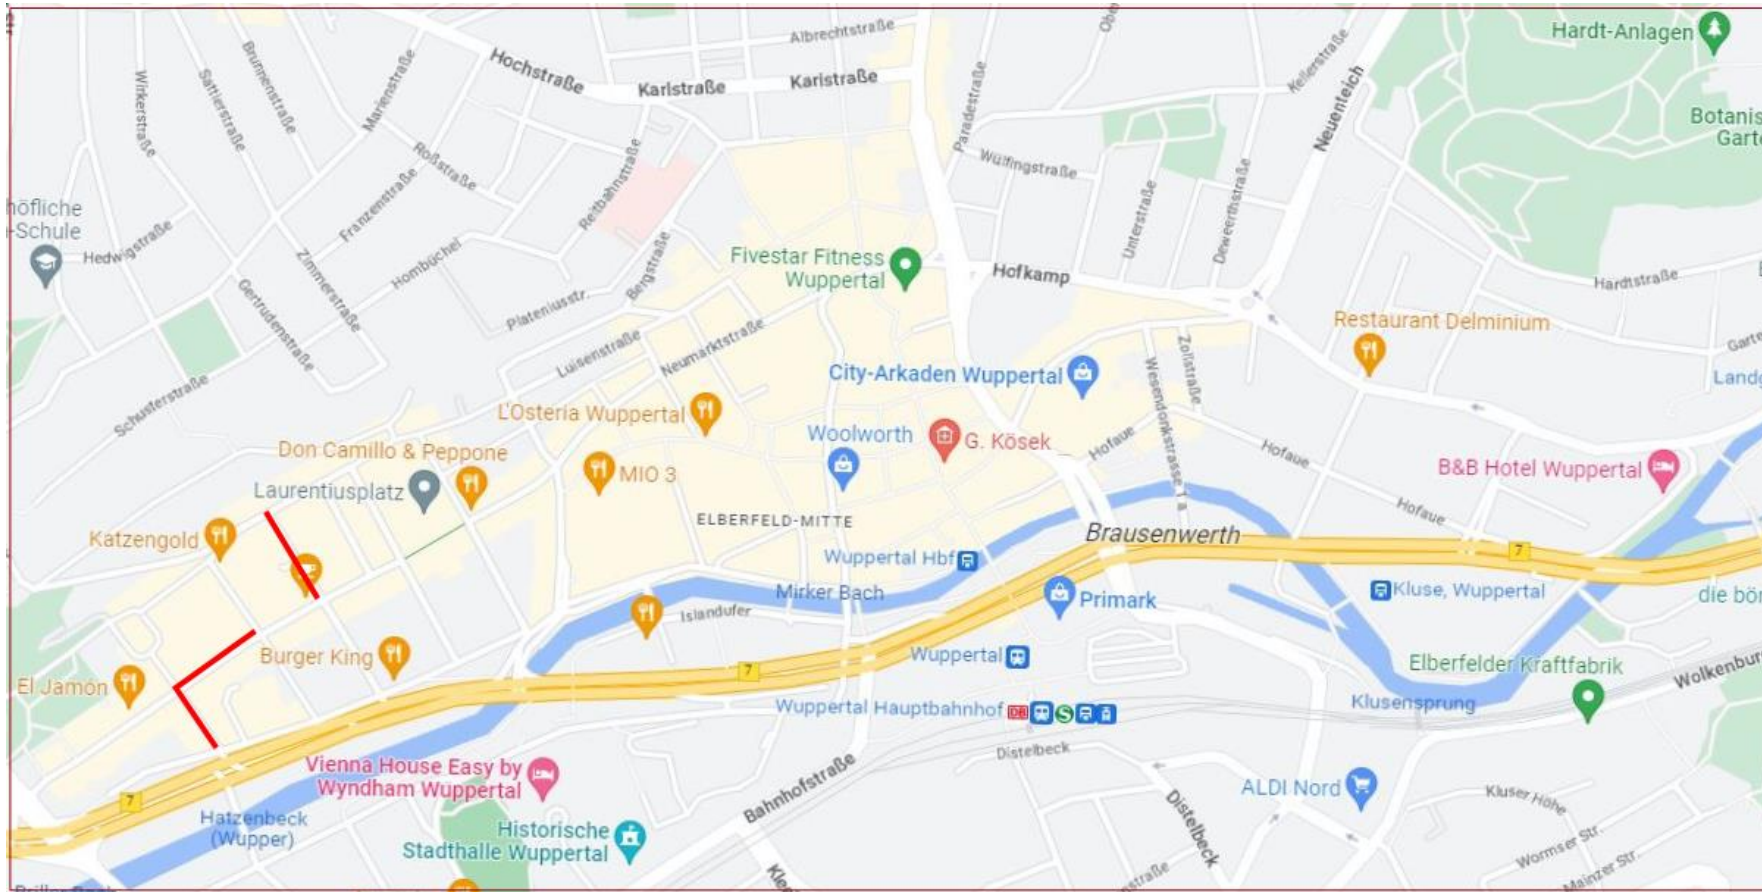

# Geplante Arbeiten in 2033


Osterfelderstraße, Kolpingstraße, Laurentiusstraße

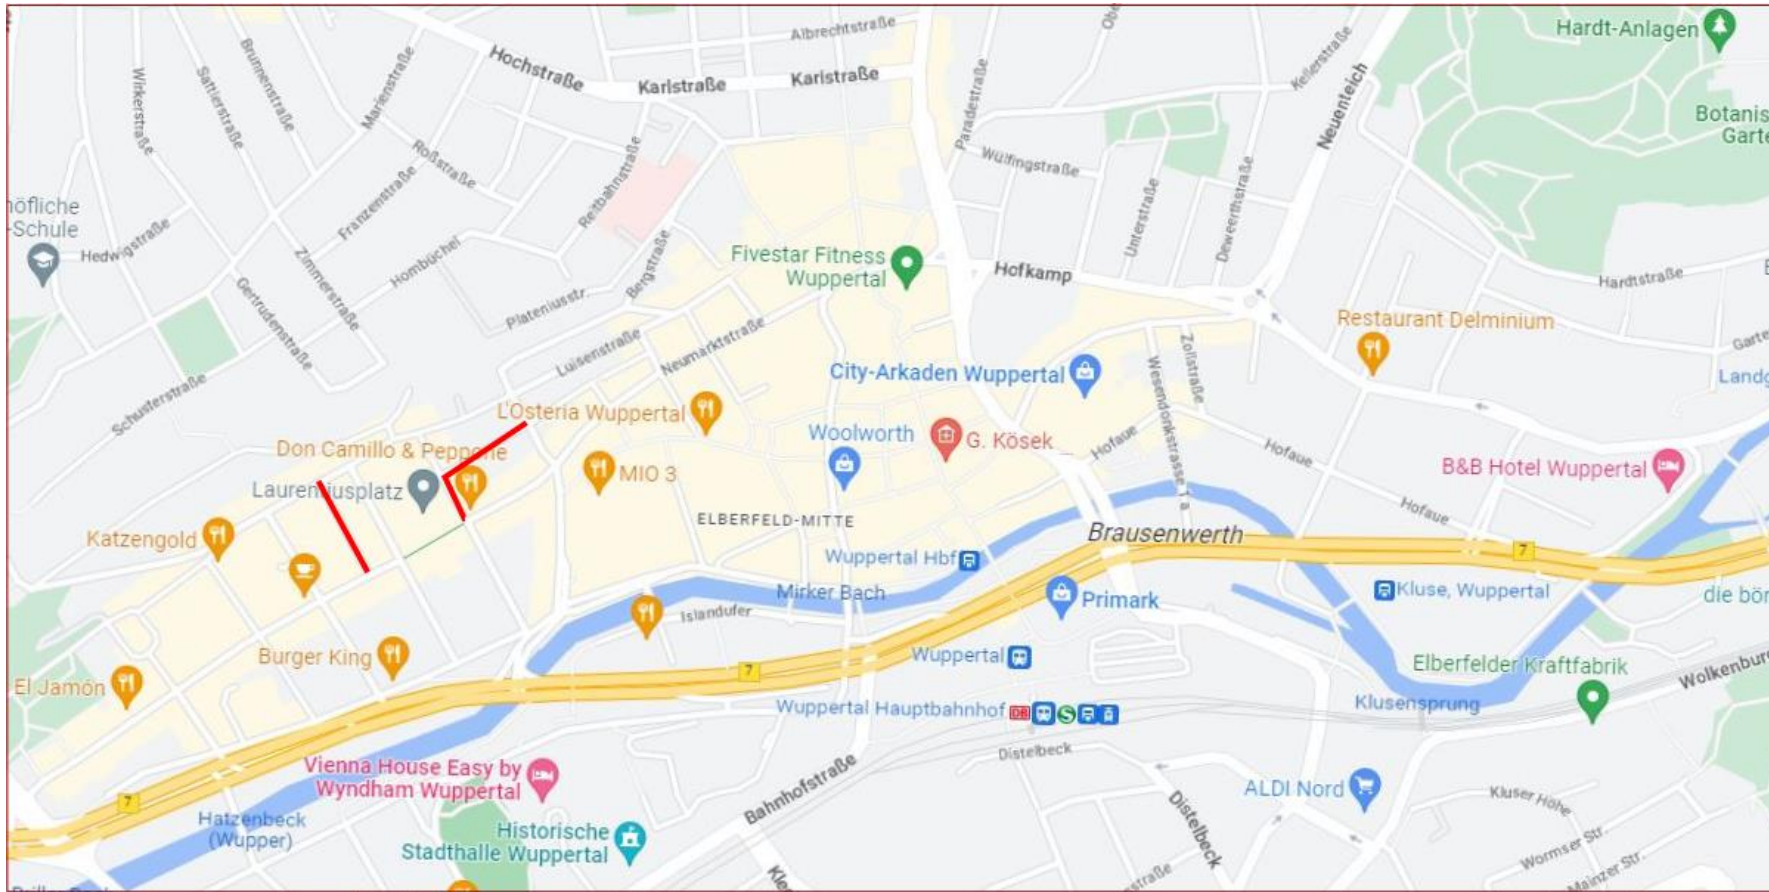



# Geplante Arbeiten in 2034

Luisenstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Sophienstraße,  
Untergrünwalder-Straße

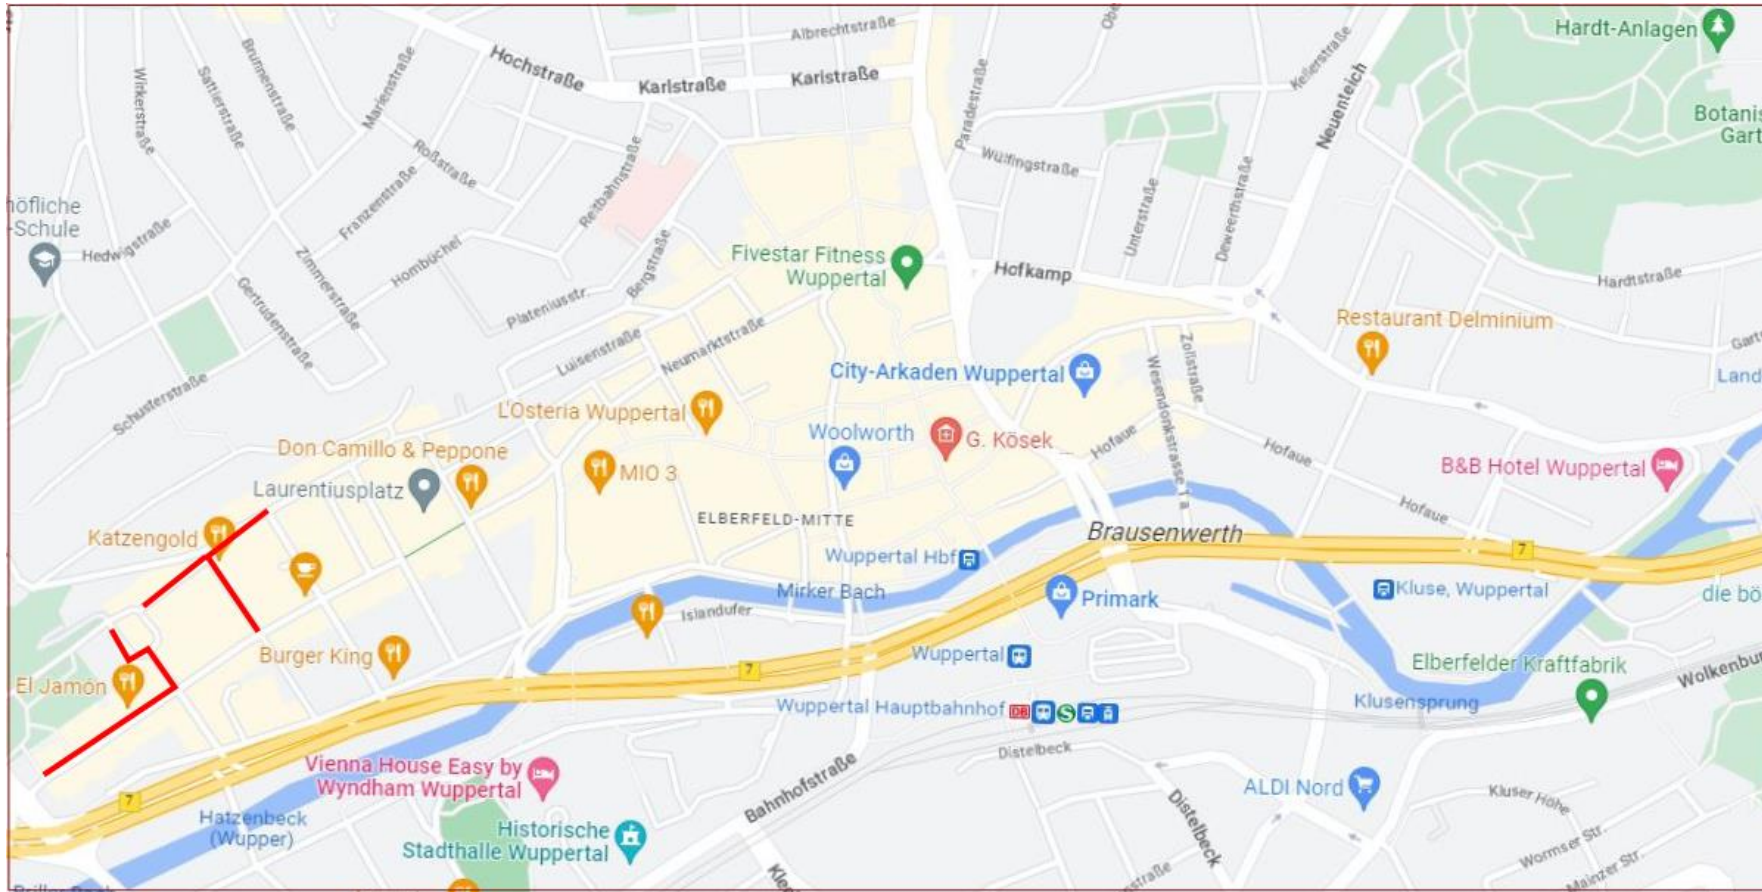

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.

